UNIVERSIDAD DE COSTA RICA
SISTEMA DE ESTUDIOS DE POSGRADO

EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS DE PROYECTOS EN LA OFICINA REGIONAL DE UICN PARA MESOAMÉRICA

AGRADECIMIENTOS

A Dios, por bendecir mi vida, la de mi familia y la de todas las personas que quiero y aprecio mucho.

A doña Marta Picado Mesén, ex Directora de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la UCR, por sus enseñanzas, apoyo, confianza, palabras de aliento y muestras de aprecio a lo largo de todo el tiempo que he estado en Costa Rica.

A Alejandro Imbach, mi Director de Tesis, por sus enseñanzas, orientaciones, acompañamiento, dedicación, paciencia, persistencia y palabras de motivación durante el periodo que ha durado esta evaluación. Siempre le estaré agradecida.

A don Jesús Cisneros, Coordinador de la Unidad de M&E de ORMA, por su colaboración en el desarrollo de esta evaluación.

A mis compañeras y compañeros de la Maestría, por su amistad, muestras de cariño y aprecio, confianza y por haberme hecho sentir tan a gusto en Costa Rica.

Y por último, al Dr. Charles Aker, por su amistad y apoyo incondicional; al Lic. Juan Carlos Ortega, por su apoyo durante todo este tiempo; a la Lic. Montserrat Gómez de la Fuente por su linda amistad;

Tabla de contenidos

Dedicatoria ii

Agradecimientos iii

Hoja de aprobación iv

Tabla de contenidos v

Resumen en español ix

Lista de tablas x

Lista de figuras xi

Lista de gráficos xii

Lista de abreviaturas xiii

Introducción 1

CAPÍTULO I: Contexto y antecedentes de la gestión de la evaluación externa de proyectos en ORMA

1.1 Contexto institucional 3

1.1.1 La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 3

1.1.2 La Oficina Regional de la UICN para Mesoamérica 6

1.2 Antecedentes institucionales 10

1.2.1 Política de la evaluación de la UICN 10

1.2.2 Metaevaluaciones en la UICN 13

1.2.3 Manual de evaluación de la UICN 14

CAPÍTULO II: Marco evaluativo

2.1 Antecedente de la evaluación 17

2.2 Contexto de la evaluación 18

2.3 Condiciones que favorecieron o limitaron la evaluación 21

2.4 Justificación de la evaluación 22

2.5 Problema de evaluación 23

2.6 Objeto de evaluación 24

2.7 Objetivos de evaluación 25

2.8 Interrogantes de evaluación 25
2.9 Criterios de evaluación 26

Capítulo: III: Marco teórico referencial

3.1 ¿Qué se entiende por gestión? 32
3.2 ¿Qué se entiende por gestión de la evaluación externa de proyectos? 33
3.2 1 Delimitación conceptual de la evaluación externa de proyectos 33
3.2.2 Definición de la gestión de la evaluación externa de proyectos 37
3.2.3 Roles de los implicados en la gestión de la evaluación externa de proyectos 37
3.2.4 Fases de la evaluación en la gestión de la evaluación externa de proyectos 38
3.2.5 Esquema de la gestión de la evaluación externa de proyectos 40
3.2.6 ¿Qué se entiende por aprendizaje y adaptabilidad? 43
3.2.7 ¿Qué se entiende por legitimidad organizacional? 45
3.3 Modelo de la gestión de la evaluación externa de

CAPÍTULO V: Hallazgos y conclusiones

5.1 ¿De qué manera se lleva a cabo la gestión de evaluación externa de proyectos en ORMA?, ¿cuáles son las fortalezas y debilidades? 68

5.1.1 Fase de negociación de la evaluación 69

5.1.2 Fase de diseño de la evaluación 70

5.1.3 Fase de implementación y seguimiento de la evaluación 73

5.1.4 Otros temas 79

5.1.5 Uso del Manual de evaluación de la UICN 80

5.2 ¿De qué manera ORMA usa la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto y a nivel del Área de Programa? 84

5.2.1 Uso del proceso de la evaluación para promover el aprendizaje del personal de la organización responsable de gestionar la evaluación externa de proyectos 85

5.2.2 Uso de los resultados de la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto 86

5.2.3 Uso de los resultados de la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del Área de Programa 87

5.3 ¿De qué manera las acciones estratégicas que se realizan durante los procesos de la evaluación están incidiendo en la legitimidad de la organización frente a su personal interno? 88

5.4 ¿En qué medida el Manual de evaluación de la UICN contiene los elementos metodológicos necesarios para su aplicación efectiva? 90

5.5 ¿En qué medida los lineamientos del Manual son comprehensivos de los estándares de calidad actuales en el campo de la evaluación? 96

CAPÍTULO VI: Recomendaciones

6.1 Normalización de la gestión de la evaluación externa de proyectos 102

6.2 Fase de negociación de la evaluación 103

6.3 Fase de diseño de la evaluación 103

6.4 Fase de implementación y seguimiento de la evaluación 105

6.5 Otros temas relacionados con las fases de la evaluación 107
6.6 Uso de la evaluación para el aprendizaje del Área de Programa 107
6.6.1 A nivel del equipo técnico de proyecto 107
6.6.2 A nivel del Área de Programa 108
6.7 Uso de la evaluación para el fortalecimiento de la legitimidad organizacional 109
6.8 Manual de evaluación de la UICN 110

LISTA DE FIGURAS

Figura 1:	Distribución de las oficinas que conforman la red mundial de la UICN	6
Figura 2:	Estructura organizacional de ORMA	9
Figura 3:	Aspectos generales de la Política y propósitos de la evaluación en la UICN	12
Figura 4:	Lineamientos para la gestión de evaluaciones del Manual de evaluación de la UICN	16
Figura 5:	Esquema de la gestión de la evaluación externa de proyectos	42
Figura 6:	Modelo evaluativo	56

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: ¿Ha usado este Manual en evaluaciones externas de proyectos? 81
Gráfico 2: Sirve el Manual para la conducción de evaluaciones externas de proyectos 81
Gráfico 3: Sus contenidos se ajustan a las necesidades actuales de ORMA en la conducción de evaluaciones externas de proyectos 82
Gráfico 4: En general, los lineamientos metodológicos propuestos en la Guía, le parecen 82
Gráfico 5: Conoce otros manuales o guías de evaluación 83

INTRODUCCIÓN

La gestión de la evaluación externa de proyectos en ORMA es una función organizacional administrada por los coordinadores de las unidades temáticas. Su implementación ha dependido tradicionalmente del acuerdo definido con el cooperante en la etapa del contrato del proyecto así como del trabajo realizado por los evaluadores externos contratados para realizar esa labor. Así, las evaluaciones que se han estado gestionando en ORMA han sido principalmente evaluaciones externas de medio término o evaluaciones externas finales.

Por las importantes implicancias que tiene esta función organizacional en el mejoramiento de la eficacia de los proyectos, así como, por la incidencia en la manera en como los cooperantes y otros actores juzgan el trabajo realizado en la organización, el personal de ORMA encargó la realización de la evaluación de la gestión de las evaluaciones externas de proyectos, la cual se delimitó a las actividades realizadas por el personal de la Oficina implicado en esta función organizacional.

Esta evaluación se realizó con la finalidad de proporcionar información relevante para la toma de decisiones sobre las actividades que actualmente se

(ORMA). Asimismo, se describe las acciones e iniciativas estratégicas que sentaron las bases para la normalización de la evaluación en la UICN.

En el capítulo II: ³0DUFR HYDOXDWLYR´ se presentan los elementos que guiaron la realización de esta evaluación. Estos elementos están organizados de la siguiente manera: antecedentes de la evaluación; contexto de la evaluación; alcances y limitaciones de la evaluación; justificación de la evaluación: problema de la evaluación; objeto de evaluación; objetivos de la evaluación; interrogantes de la evaluación y criterios de la evaluación.

En el capítulo III:

CAPÍTULO I

CONTEXTO Y ANTECEDENTES

cuenta con la participación de más de 1000 organizaciones, entre Estados, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales[2].

La misión y visión de la UICN, las cuales coinciden en alguna medida con los mandatos o misiones de las diversas organizaciones que la conforman, son las siguientes:

Fuente: UICN: Programa Mesoamericano 2005-2008, p. 8.

El marco de acción a través del cual la Unión responde a su visión y misión se basa en lo establecido en el Programa de la UICN[3]. En líneas generales, el enfoque de trabajo de este Programa se sustenta en el conocimiento, empoderTmpl2(: P)-8o319(s)95

En la Unión, los tres pilares constitutivos encargados de implementar las acciones establecidas en el Programa de la UICN son: sus miembros, sus comisiones y el secretariado. Los cuales se identifican a continuación[5].

- Miembros: La Membresía está conformada por aquellas organizaciones que tienen mandatos que concuerdan con el mandato de la UICN. Estas organizaciones pueden ser Estados soberanos, agencias gubernamentales y organizaciones no gubernamentales.
- Comisiones: Las Comisiones están conformadas por especialistas voluntarios en temas medio ambientales. Estas personas que pertenecen a organizaciones que pueden o no ser parte de la Membresía, contribuyen con su conocimiento a la consecución de los propósitos de la UICN.
- Secretaría: La secretaría está conformada por el personal técnico y administrativo. Es el ente responsable de ejecutar las acciones del Programa de la UICN en los ámbitos local, nacional y regional. En el ámbito regional, la secretaría opera a través de Oficinas Regionales.

Desde el punto de vista administrativo, la UICN realiza sus operaciones a través de la oficina central (Sede Mundial) y la red de oficinas distribuidas en diferentes partes del mundo. La oficina central está ubicada en Gland, Suiza y las oficinas descentralizadas están ubicadas en las 8 regiones en donde opera la UICN (ver Figura 1).

Respecto al financiamiento de sus actividades, la administración central de la UICN depende principalmente de los aportes y las subvenciones de los países y de la Membresía; mientras que los programas y los proyectos, los cuales en su mayor parte son gestionados en las oficinas descentralizadas, dependen principalmente de los aportes de los donantes bilaterales y multilaterales[6]. Es así que el trabajo de la UICN en las regiones es posible gracias al aporte económico de estos socios claves para la organización.

[5] Ibíd., pp. 8 y 9

[6] Información tomada de la traducción realizada por el personal de ORMA de un apartado del documento titulado: A synthesis of evaluations of environmental development assistance by multilateral organizations by

Figura 1

Distribución de las oficinas que conforman la red mundial de la UICN

Fuente: El Programa 2005-2008 de la UICN. Muchas voces, una tierra. 2004, p.4.

1.1.2 La Oficina Regional de UICN para Mesoamérica

La Oficina Regional de UICN para Mesoamérica, creada en 1988 y con ubicación en San José, Costa Rica, es la oficina representante de la secretaría en la región mesoamericana. Es la encargada de coadyuvar en el logro de la misión de la UICN en la Región. Los países que abarca son los siguientes: México, Guatemala, Belice, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Cuba y República Dominicana. También comprende la región Caribe.

Su visión, misión y objetivo de desarrollo son los siguientes:

Visión: ³8QD 0HVRDPpULFD MXVWD TXH YDORUD OD Y

Misión: ³&RQVHUYDU OD LQWHJULGDG \ GLYHUVLGDG que todo uso de los recursos naturales sea socialmente equitativo y ecológicamente VRVWHQLEOH´

Objetivo de Desarrollo: ³/RV HFRVLVWHPDV FODYHV GH 0HV XWLOL]DGRV VRVWHQLEOHPHQWH PHMRUDQGR OD

Fuente: UICN: Programa Mesoamericano 2005-2008, p. 26.

organizacionales: Dirección Regional, coordinaciones del Área de Programa, coordinaciones del Área de Apoyo Operacional, Unidad de Membresía y Unidad de Comunicaciones.

- Área de Programa, unidad responsable de coordinar y garantizar la participación de personal de ORMA en la implementación del Programa Mesoamericano. Actualmente, esta unidad está conformada por las siguientes unidades organizacionales:

- Unidad de Desarrollo Humano: Unidad encargada de administrar y desarrollar el factor humano.
- Unidad de Finanzas: Unidad encargada de la gestión y administración de los recursos financieros.

Figura 2

Estructura Organizacional de ORMA



Fuente: Adaptación propia en base al Organigrama de ORMA 2009.

1.2 Antecedente

sus propósitos, criterios, principios y tipos de evaluación; cuáles son las funciones y responsabilidades en materia de evaluación; y de manera muy general, presentan algunos aspectos procedimentales para la gestión de la evaluación (ver Figura 3). En este sentido, la Política es el documento que sienta las bases para la normalización de la evaluación en la UICN, y como se señala en el mismo documento, todo el personal implicado en las evaluaciones debería conocer estas normas y estar en condiciones de aplicarlas[14].

Para un mayor acercamiento a la conceptualización de la evaluación en la UICN, a continuación se presentan los siguientes elementos: definición y propósitos de la evaluación.

Definición de la evaluación en la UICN:

> ³Una determinación periódica, lo más sistemática e imparcial posible, de la pertinencia, eficacia, eficiencia, efectos y sostenibilidad de una política, programa, proyecto,Comisión o unidad organizacional, en el contexto de objetivos enunciados. 3 X H G H W D P E L p Q L Q F O X L U X Q D H Y D O X D F L y Q G H O R V H [15]

Propósitos de la evaluación en la UICN:

- ³ $ S U H Q G L] D M H \: E s t e a s p e c t o s e r e f i e r e a l u s o d e l a e v a l u a c i ó n como parte del entorno del aprendizaje de la UICN, sus asociados y sus miembros. Ello implica la creación de un ambiente que involucre al personal y a sus asociados de forma creativa para aprender a mejorar el trabajo de la UICN.
- Rendición de cuentas: Las evaluaciones forman también parte del sistema general de rendición de cuentas de UICN. La UICN debe poder demostrar a sus miembros, socios y donantes si sus políticas, programas y operaciones están funcionando bien, y que sus recursos son utilizados de una manera responsable´ [16].

[14] Ibíd., pp.2-11
[15] Ibíd., p.1
[16] UICN: La Gestión de Evaluaciones en la UICN: Una Guía para los Directores de Programas y Proyectos de la UICN Gland, Suiza y Cambridge, Reino Unido, 2004, pp.6 y7.

Figura 3

Aspectos generales de la Política y propósitos de la evaluación en la UICN

Vínculos de la evaluación con otros mecanismos de retroalimentación de información

1.2.2 Metaevaluaciones en la UICN

En la UICN se realizaron dos metaevaluaciones, la primera se realizó en el 2000 y la segunda en el 2003. La primera metaevaluación tuvo como propósito evaluar la calidad de las evaluaciones realizadas en la UICN de 1994 a 2000, así como establecer una línea base que permitiera medir la mejora de la calidad de las futuras evaluaciones. La segunda metaevaluación tuvo como propósito evaluar las evaluaciones realizadas en la UICN de 2000 a 2002, así como de medir el grado de avance en el cumplimiento de los estándares de calidad para las evaluaciones[17].

En términos generales, mientras los resultados de la

- Los administradores de la Comisión de la UICN que encargan evaluaciones necesitan prestar mayor atención al propósito, metodología y la sección de resultados de los informes de evaluación.
- La unidad de encargo de la UICN debería solicitar referencias claras para el KRAs (Áreas de resultados claves) objetivos del componente del programa en evaluación, en términos de referencia de evaluación y planes de trabajo.[19]

En síntesis, las recomendaciones de ambas metaevaluaciones señalaron que la UICN tenía que seguir mejorando la calidad de sus evaluaciones. En línea con esto, en la metaevaluación del 2003 se indica lo siguiente: ³FRPR VH LQIRUPy HQ OD metaevaluación, («) la conclusión predominante de la segunda metaevaluación es la falta GH HVWDQGDUL]DFLyQ TXH H[LVWH HQ ODV HYDOXDFLRQ[20]

1.2.3 Manual de evaluación de la UICN

Con el fin de mejorar la calidad de las evaluaciones, la Iniciativa de Seguimiento y Evaluación de la UICN preparó en el 2004 el Manual de evaluación de la UICN,

Figura 4

Lineamientos para la gestión de evaluaciones del Manual de

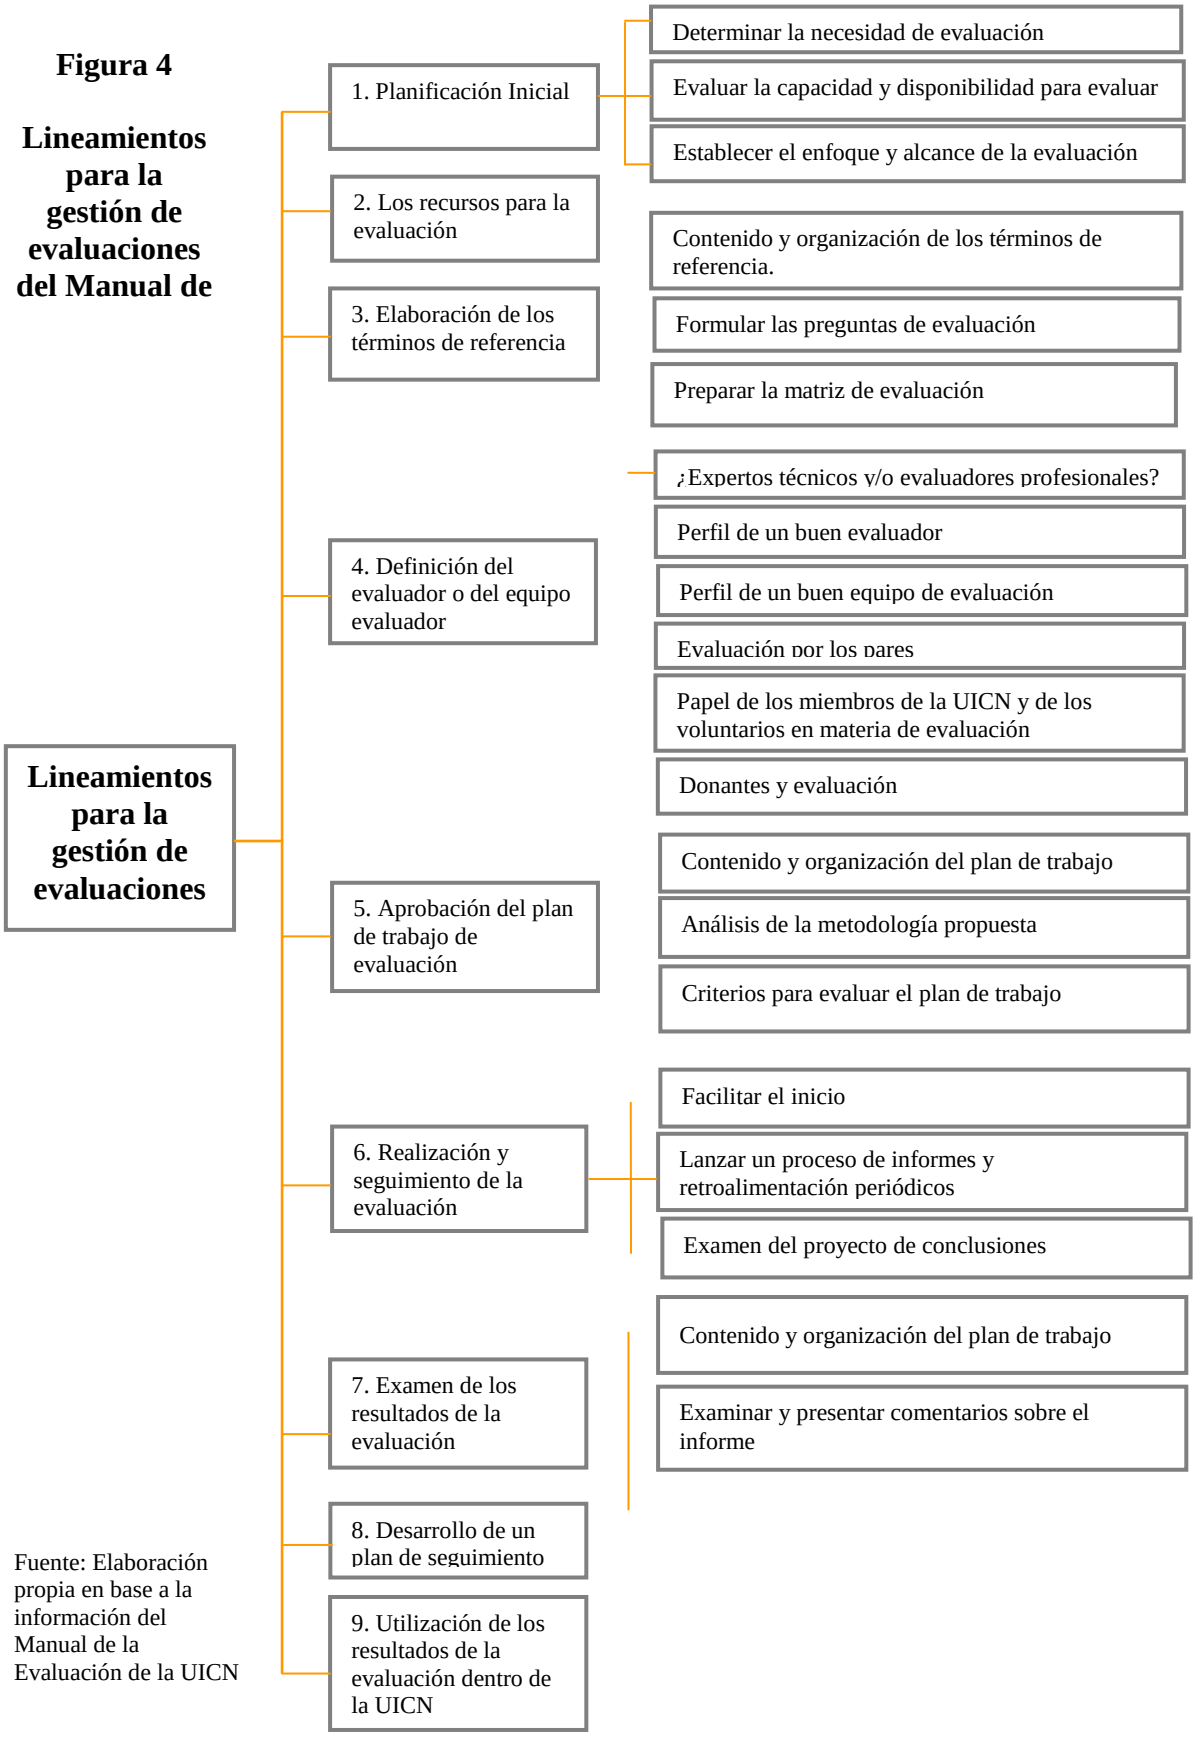

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Manual de la Evaluación de la UICN

En estos proyectos las evaluaciones que se negocian también son evaluaciones externas de medio término o finales.

De esta manera, la negociación de los proyectos con fondos no reembolsables, así como la negociación de las evaluaciones de los mismos, están bajo la responsabilidad de los coordinadores de las unidades temáticas, quienes, en el primer tipo de proyecto establecen una relación directa con el cooperante y, en el segundo tipo, una relación mediada por la Sede Mundial.

Ahora bien, para tener una idea del ritmo de cómo ocurren las evaluaciones en ORMA, en la tabla 2 se presenta el mapeo de evaluaciones de proyectos correspondientes a los Programas Mesoamericanos del 2005-2008 y del 2009-2012.

Tabla 2 . .

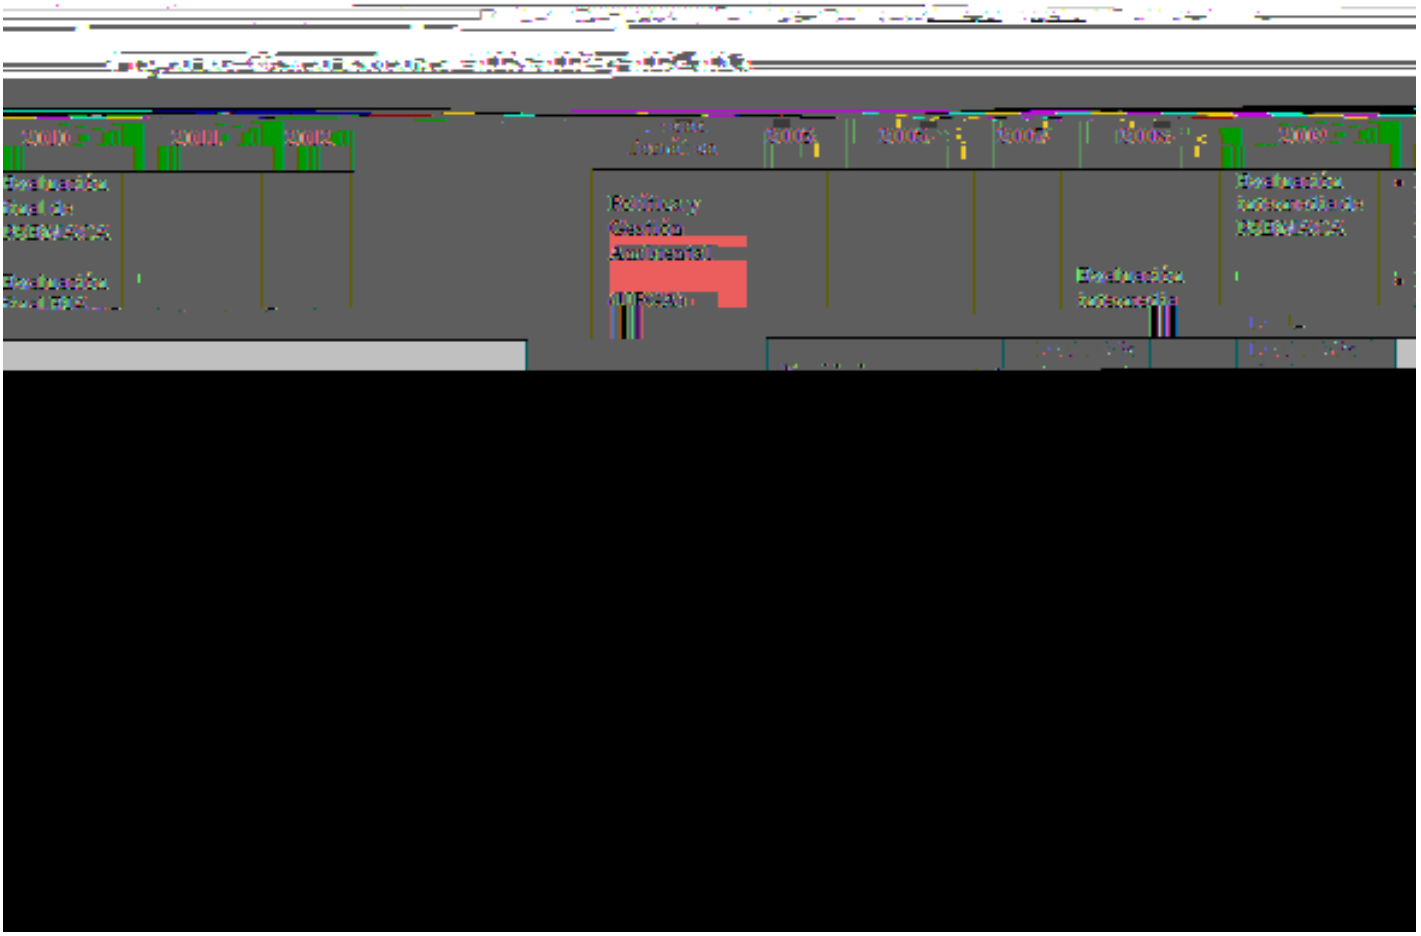

En esta tabla se identifican 13 evaluaciones, de las cuales:

- Una evaluación es de un proyecto mundial:
  - Evaluación intermedia del proyecto LLS.
- Once evaluaciones son de proyectos de cooperación:
  - Evaluación intermedia, final I y final II del proyecto ALIANZAS.
  - Evaluación intermedia y final de PREMACA.
  - Evaluación intermedia y final de EIA.
  - Evaluación Value for Money.
  - Evaluación final del proyecto Tacaná.
  - Evaluación intermedia y final del proyecto Lachuá.
- Una evaluación es solicitada únicamente por ORMA.
  - Evaluación externa de desempeños de Consorcios.

Este mapeo de evaluaciones muestra que los cooperantes solicitan para los proyectos que financian, en algunos casos, evaluaciones intermedias y finales; en otros casos, solo evaluaciones intermedias, y en otros, solo evaluaciones finales. En dicho sentido, las evaluaciones en ORMA también constituyen una actividad importante que realiza el personal de la organización.

Algunas características generales del Sistema de Evaluación en ORMA

En ORMA, el sistema de evaluación opera en dos niveles:

- A nivel regional, evaluación programática.
- A nivel de las unidades temáticas, evaluación de proyectos.

La evaluación programática tiene por finalidad evaluar el cumplimiento de los resultados anuales y cuatrianuales del Programa Mesoamericano, así como en qué medida la suma de los resultados de los proyectos implementados en las unidades temáticas contribuyen al logro de dicho Programa. De esta manera, la evaluación programática es un proceso que se sustenta en el análisis de los resultados de las evaluaciones externas de los proyectos.

Los responsables principales de gestionar estas evaluaciones son los siguientes:

- El Coordinador de la Unidad de M&E (responsable de la evaluación programática).
- Los coordinadores de las unidades temáticas (responsables de las evaluaciones externas de proyectos).

En términos generales, los actores implicados en la gestión de la evaluación externa de proyectos son los siguientes:

- De las Unidades Temáticas:
  - Coordinador de la unidad temática en donde se ejecuta el proyecto a ser evaluado (responsable principal).
  - Coordinador del proyecto a ser evaluado.
  - Equipo técnico del proyecto.
  - Punto Focal de M&E de la UT respectiva.
- Del Área de Programa (personal de apoyo a las unidades temáticas):
  - Directora Regional.
  - Coordinador Regional de Programa.
  - Coordinador de la Unidad de M&E.
- Del ámbito externo:
  - Cooperantes.
  - Evaluadores externos.
  - Iniciativa de M&E de la UICN.
  - Beneficiarios directos e indirectos.

2.3 Condiciones que favorecieron o limitaron la evaluación

Los aspectos principales

- Contribuye a que el personal de la organización reconozca cuáles son las fortalezas y las debilidades en la gestión de las evaluaciones externas de proyectos, y cómo estos pueden estar afectando positiva o negativamente el crecimiento y la sostenibilidad de la organización.

- Promueva el aprendizaje de los actores implicados en el proceso de evaluación, particularmente el de la evaluadora, en el sentido que consolida el aprendizaje adquirido en los cursos teóricos de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la UCR.

2.5 Problema de evaluación

La actividad principal que se realiza en ORMA es la gestión de proyectos para la conservación de la naturaleza y el desarrollo sostenible de los pueblos de la región. Estos proyectos, que en su mayoría son financiados por los cooperantes, tienen programados en su ciclo de gestión, evaluaciones externas de medio término o evaluaciones externas finales. Por lo que la evaluación se constituye en otra de las actividades importantes que se realiza en la organización.

En este sentido, garantizar la calidad de las evaluaciones solicitadas por los cooperantes y realizadas por evaluadores externos,

Es por esta razón que la realización de esta evaluación está orientada en determinar de qué manera el personal de ORMA está gestionando actualmente los procesos evaluativos en las unidades temáticas y en cómo el uso de los resultados obtenidos en estos procesos están promoviendo el aprendizaje y la legitimidad organizacional frente a su personal interno.

Por otro lado, y como complemento al análisis de cómo se gestionan las evaluaciones externas de proyectos en ORMA, esta evaluación también está orientada en establecer en qué medida el Manual de evaluación de la UICN constituye una herramienta metodológica de calidad para la gestión de estas evaluaciones.

2.7 Objetivos de evaluación

El objetivo principal de esta evaluación es el siguiente:

[3]**Analizar los mecanismos, procedimientos y espacios mediante los cuales los procesos evaluativos que conduce ORMA promueven el aprendizaje dentro del Área de Programa (aprendizaje organizacional) y fortalecen la legitimidad de la organización frente a su personal interno (personal de ORMA) ´.**

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Identificar los mecanismos, procedimientos y espacios mediante los cuales se conducen las evaluaciones externas de proyectos.
- Establecer los puntos fuertes y débiles de la gestión de evaluaciones externas de proyectos.
- Determinar de qué manera la gestión de evaluación externa de proyectos está promoviendo el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto y a nivel del Área de Programa.
- Establecer en qué medida la gestión de evaluación externa de proyectos está contribuyendo en el fortalecimiento de la legitimidad organizacional frente a su personal interno.
- Verificar la calidad de los lineamientos metodológicos para la gestión de la evaluación propuestos en el Manual de Evaluación de la UICN en contraste con los estándares de calidad actuales en materia de evaluación.

2.8 Interrogantes de evaluación

El problema de evaluación plantea la necesidad de que esta evaluación responda a la siguiente interrogante principal:

¿De qué manera la gestión de evaluación externa de proyectos en ORMA promueve el aprendizaje dentro del Área de Programa (aprendizaje organizacional) y fortalece la legitimidad de la organización frente a su personal interno (personal de ORMA)?

Para responder a esta interrogante se plantean las siguientes interrogantes específicas:

- ¿De qué manera se lleva a cabo la gestión de evaluación externa de proyectos en ORMA? ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades?
- ¿De qué manera en ORMA se usa la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto y a nivel del Área de Programa?
- ¿De qué manera las acciones estratégicas que se realizan durante los procesos de evaluación están incidiendo en la legitimidad de la organización frente a su personal interno?
- ¿En qué medida el Manual de Evaluación de la UICN contiene los elementos metodológicos necesarios para su aplicación efectiva?
- ¿En qué medida los lineamientos del Manual son comprehensivos de los estándares de calidad actuales en el campo de la evaluación?

2.9 Criterios de evaluación

Los criterios de evaluación fueron los siguientes:

- **Gestión de la evaluación externa de proyectos:** Desde la perspectiva de esta evaluación, la gestión de la evaluación externa de proyectos se entiende como el proceso que consiste en la negociación; diseño; implementación y seguimiento; y uso de los procesos evaluativos y sus resultados, para promover el aprendizaje y fortalecer la legitimidad organizacional. Un desarrollo más exhaustivo de este criterio, así como de los dos siguientes, se presenta en el capítulo III Marco teórico referencial.

- **Aprendizaje organizacional**: Desde la perspectiva de esta evaluación, el aprendizaje organizacional es entendido como el proceso mediante el cual las personas involucradas en la gestión de la evaluación externa de proyectos en ORMA utilizan la evaluación para el aprendizaje y mejoramiento de la eficacia de los proyectos presentes y futuros, así como para promover el aprendizaje dentro del

Área de Programa. En esta evaluación, el aprendizaje se verificó a través de la existencia de planes de acción (documentos en los cuales los destinatarios de los resultados de la evaluación dan respuesta a las recomendaciones de los informes de evaluación) y a través de la participación en espacios de discusión y reflexión sobre las experiencias y los resultados del proceso evaluativo.

- **Legitimidad organizacional:** Desde la perspectiva de esta evaluación, la legitimidad en ORMA es entendida como la percepción que de ella tiene el personal interno de la organización, por realizar acciones eficaces y acordes a lo que se considera aceptable y deseable dentro del marco de su misión organizacional. En esta evaluación, la constatación de la legitimidad se verificó a través de los siguientes criterios:
  - Transparencia en la divulgación de los resultados de la evaluación: existencia de

3= Nivel alto de precisión: Se indica los pasos necesarios y con claridad suficientes para poder concretar una determinada etapa o sub etapa de evaluación.

- **Comprehensión de los estándares de evaluación de la CAD ±OCDE (2010) en los lineamientos del Manual**: Se entiende como el grado en que los estándares de evaluación de la CAD-OCDE están presentes o cubiertos por los lineamientos del Manual de evaluación de la UICN. Los niveles que se aplicaron para valorar este criterio fueron los siguientes:
  1 = Nivel bajo de comprehensión: Los lineamientos del Manual cubren mínimamente el estándar de evaluación.
  2 = Nivel medio de comprehensión: Los lineamientos del Manual contienen la mayoría de los aspectos que señala el estándar de evaluación.
  3 = Nivel alto de comprehensión: Los lineamientos del Manual incluyen todo los aspectos que indica el estándar de evaluación.

En la tabla 3 se presenta de manera general los elementos que conforman la matriz de evaluación: objetivos, interrogantes, criterios, y técnicas e instrumentos de evaluación. Un mayor desarrollo de las técnicas e instrumentos de evaluación se presenta en el capítulo IV, ³ $ercamiento metodológico ´.

Objetivos específicos de la evaluación	Interrogantes específicas de la evaluación	Criterios de evaluación	Técnicas e instrumentos de la evaluación
• Determinar de qué manera la gestión de evaluación externa de proyectos está promoviendo el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto y a nivel del Área de Programa.	2. ¿De qué manera en ORMA se usa la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del equipo técnico de proyecto y a nivel del Área de Programa?	**Aprendizaje organizacional** Se verificó a través de los siguientes aspectos: ƒ Elaboración del plan de seguimiento. ƒ Socialización de las experiencias y productos de la evaluación.	Entrevista semiestructurada Talleres
• Establecer en qué medida la gestión de evaluación externa de proyectos está contribuyendo en el fortalecimiento de la legitimidad organizacional frente a su personal interno.	3. ¿De qué manera las acciones estratégicas que se realizan durante los procesos de evaluación están incidiendo en la legitimidad de la organización frente a su personal interno?	**Legitimidad organizacional** Se verificó a través de los siguientes aspectos: ƒ Eficacia en la gestión de los proyectos. ƒ Transparencia en la divulgación de los resultados de la evaluación.	Entrevista semiestructurada Talleres

Objetivos específicos de la

CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En este capítulo se desarrolla el concepto de gestión de la evaluación externa de proyectos como es entendido y utilizado en este informe. Las secciones principales que conforman este capítulo son las siguientes: ¿Qué se entiende por gestión?, ¿qué se entiende por gestión de la evaluación externa de proyectos?

?

- Aumentar los niveles de reconocimiento de la organización por la capacidad técnica de su personal en la consecución de los resultados esperados en los proyectos. En este sentido, la adecuada divulgación de los resultados de la evaluación permite a la organización aumentar sus niveles de legitimidad frente a sus diferentes actores.

3.2.1.2 Antecedentes de la gestión de la evaluación externa de proyectos

Esta sección se considera particularmente importante porque introduce las directrices, estándares o principios evaluativos reconocidos por teóricos y profesionales del campo de la evaluación, y porque esta información constituyó un insumo esencial para la elaboración del modelo de gestión de la evaluación externa de proyectos que se presenta más adelante.

A continuación se presenta una breve descripción de los aportes teóricos-metodológicos de cuatro reconocidos teóricos de la evaluación y de dos organismos internacionales vinculados con la elaboración de estándares para la evaluación. Respecto a los aportes de los organismos internacionales, conviene aclarar que por la cantidad de estándares y la importante explicación de cada uno de éstos, se prefirió señalar el enlace dónde se podría acceder al documento completo. Así, en este estudio sólo se señalan algunos aspectos generales.

Ballesteros (1996) sostiene que la evaluación de programas se realiza a través de un proceso normativo que comprende, una serie de etapas o fases secuencialmente organizadas y una serie de tareas o acciones para cada una de ellas. En términos generales, la autora señala que la realización de la evaluación de programas pasa por las fases de planeamiento de la evaluación, diseño de la evaluación, recogida y análisis de los datos, y finalmente por la preparación del informe de evaluación[27].

[27] Fernandez-Ballester

En esa misma línea, Worthen B. y Sanders J. (1988) sugieren que el trabajo evaluativo debería estar orientado por una serie de directrices y subdirectrices para las fases de planificación, conducción y uso de la evaluación.

Estos autores identifican para la planificación de las evaluaciones las siguientes directrices: 1) clarificación en la solicitud de evaluación y las responsabilidades; 2) delimitación del objeto de evaluación y análisis del contexto de evaluación; 3) identificación y selección de las preguntas y criterios de evaluación; 4) planificación de la recopilación, análisis e interpretación de la información y 5) desarrollo de un plan de gestión. Y, para la conducción y uso de la evaluación, las siguientes: 6) Sugerencias para lidiar con los aspectos políticos, éticos e interpersonales de la evaluación; 7) recopilación de información de las evaluaciones; 8) análisis e interpretación de la información de la evaluación; 9) presentación de los informes de evaluación y uso de la información de la evaluación; y 10) evaluación de la evaluación (metaevaluación)[28].

Estos dos autores, al igual que Ballesteros, proponen directrices que se deberían de tener en cuenta a la hora de realizar evaluaciones de programas o proyectos. No obstante, estos autores también proponen directrices para el uso de las evaluaciones y para la evaluación de las evaluaciones (metaevaluación). En

Desarrollo Económico (OCDE) (2010)[30], se identifican estándares para las fases de un proceso típico de evaluación, las que corresponden a la planificación, diseño, implementación y presentación del informe de evaluación; así como para las fases que son posteriores a la entrega del informe, las que están relacionadas con el seguimiento ex - post de la evaluación y la utilización de la evaluación. En términos generales, los estándares de evaluación definidos por ambas instituciones, Naciones Unidas y OCDE, se organizan en las siguientes fases de evaluación: planificación, diseño, ejecución, seguimiento y utilización de la evaluación.

Por otro parte, y relacionado con el uso de la evaluación, Michael Quinn Patton en su obra Evaluación con Énfasis en la Utilización (1997), señala que las "evaluaciones deberían ser juzgadas por su utilidad y uso real"[31]. Para este autor, una evaluación genera resultados útiles cuando centra su atención en los usos previstos de los usuarios primarios de la evaluación, y cuando esta orientación está presente en cada etapa del proceso evaluativo. En este sentido, se entiende que para Patton la gestión de la evaluación centrada en la utilización sería aquel proceso que consideraría, de principio a fin, todos aquellos aspectos que afectarían el uso real de la evaluación, como por ejemplo: la identificación de los usuarios primarios de la evaluación y de sus necesidades de información así como la participación de estos actores en las diferentes fases del proceso evaluativo.

Además, Patton también afirma que una evaluación centrada en el uso comprende por un lado, el uso de los resultados de la evaluación y, por otro lado, el uso del proceso de la evaluación. Según este autor, este segundo tipo de uso de la evaluación, el cual tiene lugar durante el proceso evaluativo, implica "ayudar al personal de los programas a aprender a reflexionar e involucrarse unos con otros desde una perspectiva evaluativa"[32]. El autor

[30] Para más detalle sobre los estándares de evaluación de la CAD-OCDE (2010) se recomienda visitar la siguiente página: http://www.oecd.org/dataoecd/55/0/44798177.pdf

[31] Patton, M. Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text. 3rd ed. London: Sage Publications, 1997, p.20.

[32] Artículo extraído de la publicación: The Evaluation Exchange, volumen IX, Nro. 4 – 2003/2004. Versión traducida por PREVAL marzo 2004, p.1. Disponle en http://preval.org/documentos/sobre el uso de la evaluacion.doc al 1 de noviembre de 2010.

considera que aprender a reflexionar evaluativamente puede tener un impacto más

- **Tercera fase: Implementación y seguimiento de la evaluación**

Es la fase correspondiente a la ejecución de la evaluación. En esta fase se desarrollan paralelamente las actividades del equipo evaluador y la del gestor de la evaluación. En términos generales, durante esta fase el gestor de la evaluación debe organizar y facilitar el trabajo del equipo evaluador; garantizar la participación de los principales usuarios de la evaluación en momentos claves del proceso (espacios de retroalimentación); revisar y discutir con los evaluadores los productos evaluativos (plan de trabajo, informes de evaluación parciales, etc.) y cualquier otro aspecto que se haya definido y señalado en los TdR. Finalmente, el gestor debe evaluar la calidad del informe de evaluación (borrador y final) y presentar comentarios sobre el mismo, en el caso que éste presente insuficiencias en algunos de sus contenidos.

- **Cuarta fase: Uso de la evaluación**

En esta propuesta, el uso de la evaluación comprende por un lado, el uso de los resultados de la evaluación y, por otro lado, el uso del proceso de la evaluación. Es por fines prácticos que en este estudio, el uso de la evaluación se ubica en la última fase del ciclo de la gestión de la evaluación externa de proyectos. Al respecto, es importante remarcar que [3]el uso de la evaluación no es algo que interesa al final de una evaluación. Al final de la evaluación, el potencial de uso ya ha sido determinado en gran medida[33], con esto se quiere decir que algunas de las tareas identificadas en las fases anteriores ya han determinado el camino para el uso real de la evaluación, como por ejemplo, la identificación de los principales usuarios de la evaluación y de sus necesidades de información (tareas propias de la fase de diseño).

En relación al uso de los resultados de la evaluación, el gestor debe encargarse de comunicar y divulgar los resultados de la evaluación tanto al personal externo como interno de la organización. En

- La comunicación de los resultados de la evaluación dentro de la organización tiene implicancias tanto en el aprendizaje individual como organizacional; éstos, a su vez, repercuten en la adaptabilidad de las personas y de la organización a un contexto dinámico; y tanto el aprendizaje como la adaptabilidad inciden directamente en el mejoramiento de la eficacia de los proyectos gestionados así

5. Mejora de la eficacia de los proyectos como resultado de la combinación de la adaptabilidad y el aprendizaje tanto individual como organizacional.
6. Fortalecimiento de la legitimidad organizacional como consecuencia de la mejora de la eficacia de los proyectos presentes y futuros, y la transparencia en la divulgación de los resultados de la evaluación.
7. Sostenibilidad organizacional como resultado del aumento de los niveles de legitimidad organizacional.

Figura 5
Esquema de la gestión de la evaluación externa de proyectos

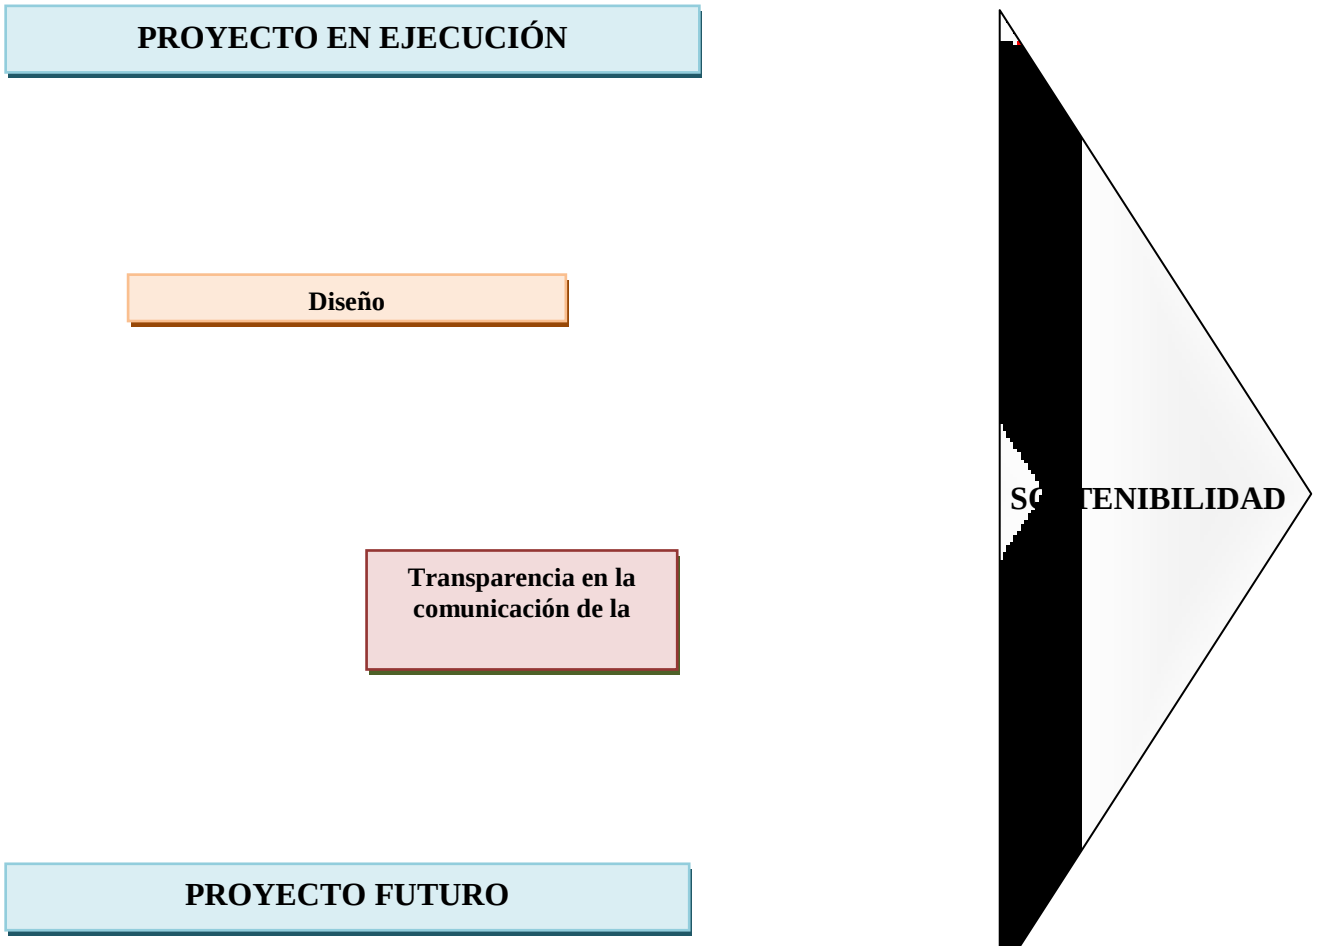

Fuente: Elaboración propia.

Para una mejor comprensión de esta conceptualización se pasará a explicar qué se entiende en esta evaluación por aprendizaje, adaptabilidad, transparencia, eficacia y legitimidad.

3.2.6 ¿Qué se entiende por aprendizaje y adaptabilidad?

Como mencionan Argyris y Schön (1978) citados en Mai R. (1996), "no existe aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual, pero el aprendizaje individual no asegura el aprendizaje organizacional"[34].

De manera general, en este estudio, el aprendizaje individual y organizacional, y la adaptabilidad se entienden de la siguiente manera:

- **Aprendizaje individual**

Es el proceso a través del cual el personal de la organización cambia de forma relativamente permanente sus conocimientos y formas de actuar, como resultado del estudio reflexivo del informe de evaluación, del intercambio de conocimientos y opiniones sobre la evaluación y de la experiencia reflexiva que vivencia durante el proceso de evaluación. Es importante indicar que bajo esta definición subyace una de las premisas del modelo de aprendizaje de Schön "la reflexión sobre la acción", la cual señala que los aprendices aprenden cuando actúan y cuando alguien les ayuda a reflexionar sobre esa actuación[35]. En esta línea Patton (1996) apunta a que el uso del proceso de evaluación es una forma de promover la reflexión y por ende el aprendizaje del personal del programa a ser evaluado.

- **Aprendizaje organizacional**

Se entiende como el proceso mediante el cual la organización adquiere, transfiere y aplica el conocimiento generado con la evaluación en el mejoramiento continuo de la planificación y gestión de los proyectos y de las evaluaciones. Parte de esta definición se

[34] Bruning R., Schraw G., Norby M., y Ronning R. Psicología cognitiva y de la instrucción. 4ª Edición. España: PEARSON-Prentice Hall, 2005, p.237.
[35] Mai R. Alianzas de Aprendizaje Organizacional: Cómo las empresas líderes americanas implementan el aprendizaje organizacional. Primera edición. México: IRWIN, 1996, p.21.

sustenta en el modelo de creación de conocimiento de Ikujurio Nonaka (1991, 1994) citado en Benavides C. y Quintana C. (2003), el cual señala, en términos generales que, para que el conocimiento sea generado, transferido y re-creado en la organización es necesario que el conocimiento tácito, el que poseen los individuos, se formalice o se explicite, de forma que puede ser aplicado por otros individuos en situaciones concretas del quehacer

- **Adaptabilidad**

Parar Mayo A. y Lank E. (1994):

> ³OD VXSHUYLYHQFLD HQ XQ PXQGR UiSLGDPHQWH FDI
> la adaptabilidad depende de la capacidad de aprender, y la capacidad de aprender depende de la motivación para el aprendizaje continuo de todo el personal de una RUJDQL]DFLyQ HQ XQ HQWRUQR GH DSR\R DO DSUHQG[37]

Desde esta perspectiva, la adaptabilidad se entiende como la capacidad que desarrollan las personas para dar respuesta a los desafíos presentes y futuros que afronta la organización producto de las dinámicas propias del ambiente en el que se desarrolla. O como lo señala &KLDYHQDWR la adaptabilidad es la capacidad para resolver problemas y reaccionar de manera flexible a las exigencias cambiantes e inconstantes del ambiente[38]

En este sentido, la adaptabilidad significa aprender de los conocimientos alcanzados con la evaluación, así como de otras situaciones,

es así, porque ese [3]isomorfismo le hace ganar legitimidad[40] y porque esto asegura que la

información sensible procedente de la evaluación de procesos gestionados por ORMA que se puedan considerar incompletos, insatisfactorios o deficientes.

3.3 Modelo de la gestión de la evaluación externa de proyectos

Anteriormente se ha presentado una conceptualización general de la gestión de la evaluación externa de proyectos. Ahora se presentará el modelo que sintetiza las actividades que se esperaría que se realicen en cada una de las fases de la evaluación. Este modelo está sustentado en los aportes teóricos-metodológicos de los autores de evaluación y de los estándares de evaluación revisados anteriormente. A continuación se describe el modelo.

Primera fase: Negociación de la evaluación

- Negociar la evaluación del proyecto con la Política o los principios básicos de evaluación institucional para la gestión de las evaluaciones de proyectos.

Segunda fase: Diseño de la evaluación

- Determinar el compromiso de los clientes de la evaluación con la gestión de una evaluación centrada en el uso del proceso y de los resultados de la evaluación.
- Identificar a los usuarios primarios de la evaluación. Es decir a los que tienen un interés directo e identificable en la evaluación y que incluye usualmente a quiénes toman las decisiones.
- Definir con los usuarios primarios de la evaluación los siguientes aspectos:
  - Necesidades de información y/o usos previstos de la evaluación.
  - Propósitos, objetivos, interrogantes y criterios de evaluación.
  - Enfoque de evaluación. En una evaluación con énfasis en la utilización, se recomienda un enfoque participativo con orientación al aprendizaje.
  - Metodología de la evaluación.
  - Productos de la evaluación.
  - Requisitos de presentación de los informes de evaluación (borrador y final).

- Procedimiento para validar los resultados preliminares de la evaluación. Aquí se

Cuarta fase: Uso de la evaluación

Como se mencionó anteriormente, el uso de los resultados de la evaluación depende en gran medida del nivel de respuesta de la evaluación a las necesidades y demandas de información identificadas en la fase de diseño de la evaluación.

Ahora bien, las actividades que se deberían de realizar en esta fase son las siguientes:

- Comunicar y difundir oportunamente los resultados de la evaluación.
  - Relacionar los resultados de la evaluación con los usuarios de éstas.
  - Preparar informes de evaluación en diversos formatos acordes con sus audiencias destinatarias (presentaciones, folletos, boletines, revistas, resúmenes, etc.) que sean claros, precisos y acordes con lo que necesitan saber los usuarios de la evaluación.
  - Identificar canales de comunicación apropiados al entorno y a las características de los usuarios

Para este autor, la evaluación de programas es la ³UHFROHFFLyQ VLVWHPiWLFD de las actividades, características y resultados de programas, para ser usada por personas específicas, con el fin de reducir la incertidumbre, mejorar la efectividad y tomar GHFLVLRQHV FRQ UHVSHFWR D OR TXH GLFKRV SURJUDP[43]

A través de esta conceptualización el autor apunta a que la realización de una evaluación se justifica en el hecho de proporcionar información que pueda ser usada por aquellas personas que tengan posibilidades de tomar decisiones sobre el programa evaluado.

Es bajo este PDUFR HYDOXDWLYR TXH HO DXWRU UHFRPLHQGD facilitar procesos de evaluación y diseñar toda la evaluación teniendo cuidado en cómo todo lo que se hace, de principio a fin, afectará el uso[44]. Así, en términos generales, el autor señala que una evaluación centrada en la utilización debe en un primer momento, identificar a los usuarios primarios previstos de la evaluación, así como los usos proyectados que éstos tienen pensado darle a la evaluación; y luego, debe considerar la participación activa de los usuarios a lo largo del proceso evaluativo, de manera que éstos perciban que la evaluación está respondiendo a sus necesidades reales de información para la toma de decisiones.

De acuerdo con los planteamientos de la psicología del uso que subyacen en la evaluación FHQWUDGD HQ OD XWLOL]DFLyQ existe mayores posibilidades de que los usuarios proyectados utilicen las evaluaciones si comprenden y se sienten dueños del proceso de evaluación y sus resultados

4.3 Participantes de la evaluación

En esta evaluación participaron 19 personas. De ORMA participaron 14 personas, y de fuera de ORMA, 5 personas. De los 14 participantes de la Oficina, 5 están implicados directamente en la gestión de la evaluación externa de proyectos y 9 de una manera indirecta. Los participantes ajenos a la Oficina fueron dos evaluadores externos que participaron en dos procesos evaluativos gestionados por el personal de ORMA, la representante de la Unidad de administración del Ciclo de Programa-Sede UICN, el profesor guía y la evaluadora. A continuación se identifican a estos participantes (para más detalle, ver Anexo 2).

4.3.1 Personal de ORMA

4.3.1.1 Personal implicado directamente en la gestión de la evaluación externa de proyectos.

Este grupo de personas estuvo conformado por los siguientes participantes:

- Coordinador Regional de Programa.
- Coordinador de la Unidad de M&E. Contacto principal en este proceso de evaluación.
- Coordinadora de la UT de AGUA.
- Coordinador de la UT de BUS.
- Punto Focal de M&E de la UT de UPGA.

La selección de estos participantes se definió de forma conjunta con el Coordinador de la Unidad de M&E. Los criterios de selección que se utilizaron fueron los siguientes:

- Ser responsable de la toma de decisiones en la gestión de las evaluaciones externas de proyectos.
- Participar en asuntos medulares en la gestión de las evaluaciones externas de proyectos.
- Haber gestionado las evaluaciones correspondientes a los informes de evaluación que se facilitaron para el análisis de la gestión de las evaluaciones externas de proyectos. Estos informes fueron los siguientes:

- **Evaluación final del proyecto ALIANZAS.** Evaluación de un proyecto de cooperación

4.3.2 Personal externo a ORMA

4.3.2.1 Evaluadores externos

En esta evaluación participaron dos evaluadores externos. Uno de ellos fue integrante del equipo de evaluación de ALIANZAS y el otro fue integrante del equipo de evaluación de PREMACA. La selección de estos evaluadores dependió principalmente de la facilidad en el acceso a ellos en términos de costo y tiempo. Por tal razón, para el caso de la evaluación de ALIANZAS, de un equipo de tres evaluadores, un holandés, un nicaragüense y un costarricense, se seleccionó al evaluador costarricense. Para el caso de la evaluación de PREMACA, de un equipo de dos evaluadores, ambos costarricenses, se seleccionó al evaluador que tenía más disponibilidad. Y, de la evaluación de LLS no se pudo contactar a ninguno de los evaluadores porque todos eran extranjeros.

4.3.2.2 Consultora de la Unidad de administración del ciclo de Programa-Sede UICN

Invitada a participar en esta evaluación como observadora de la Sede Mundial de UICN.

4.3.2.3 Profesor guía

Profesor del curso taller I y II de la Maestría en Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo de la UCR.

4.3.2.4 Evaluadora

Estudiante de la Maestría en Evaluación de Programas y proyectos de Desarrollo de la UCR.

4.4 Modelo evaluativo

El modelo evaluativo que orientó el abordaje del objeto de evaluación se sustentó en el modelo elaborado para la gestión de la evaluación externa de proyectos presentado en el capítulo III, ³0DUFR WHyULFR@ Así, este modelo evaluativo estuvo conformado por las siguientes fases: negociación, diseño, implementación y seguimiento, y uso de la evaluación.

De esta manera, el abordaje del objeto de evaluación inició con el análisis de la participación del personal de ORMA en la negociación de la evaluación, y con el análisis de las implicancias que ha tenido en los procesos evaluativos, el hecho de que una de las partes (cooperante -

Figura 6

Modelo evaluativo

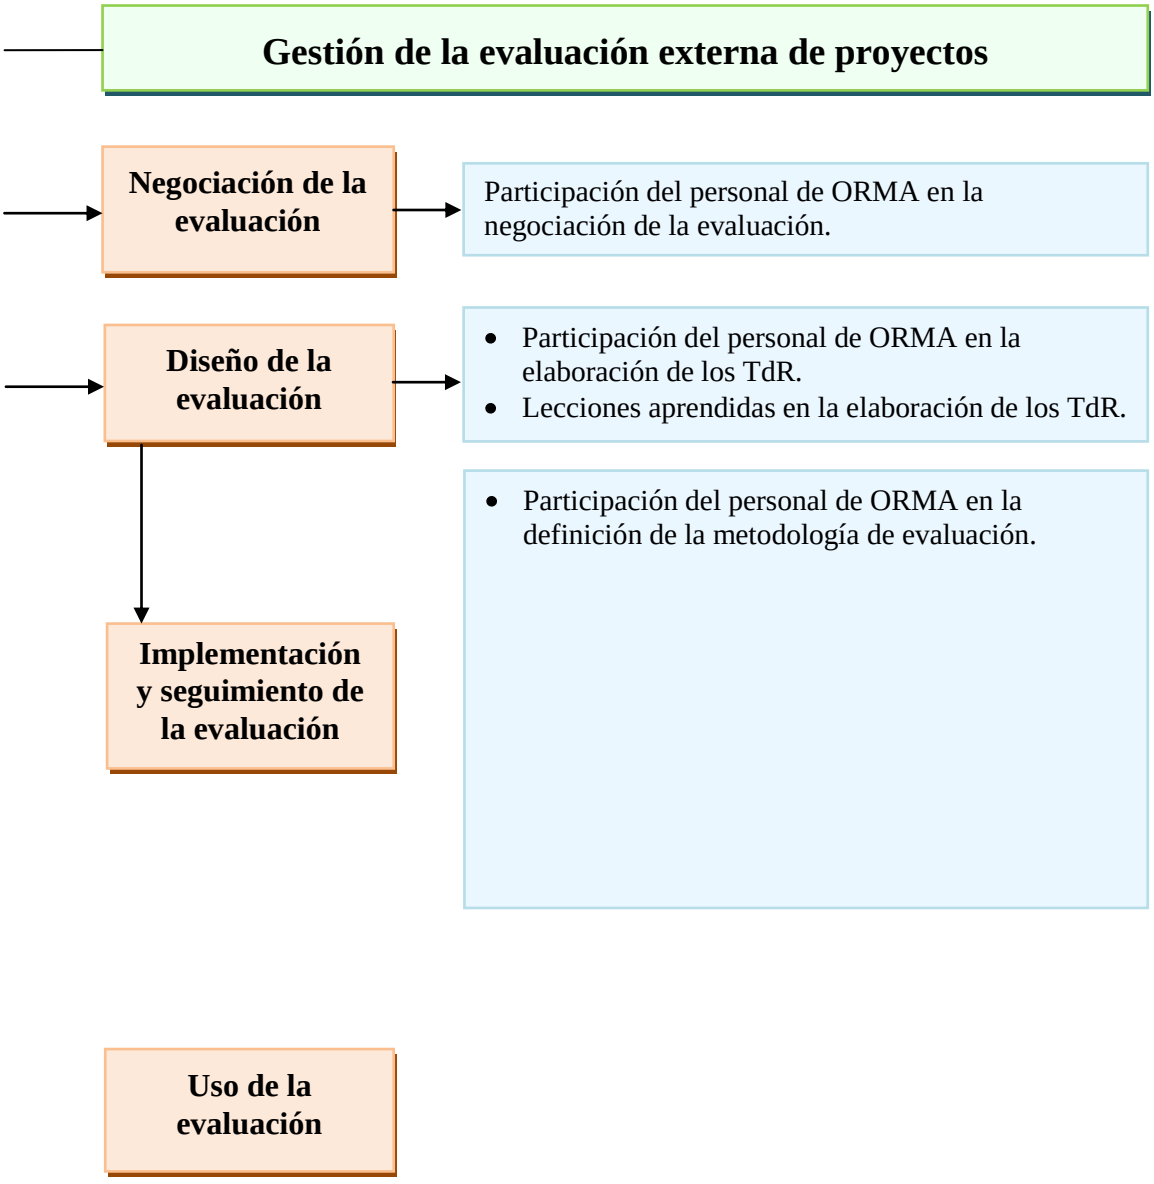

Fuente: Elaboración propia.

4.5 Técnicas e instrumentos de evaluación

- Las reuniones de análisis y revisión de los avances de la evaluación con el profesor guía, a lo largo del proceso de evaluación, fueron fundamentales para la formulación del marco teórico de la gestión de evaluación externa de proyectos.

A continuación se presentan las fases del abordaje procedimental.

4.6.1 Fase I: Fase exploratoria

El objetivo de esta fase fue explorar el objeto de evaluación (gestión de la evaluación externa de proyectos en ORMA), el cual no estaba definido ni caracterizado cuando inició el proceso de evaluación. Las actividades principales que se realizaron en esta fase, fueron las siguientes:

- Reuniones preparativas con el Coordinador de la Unidad de M&E.
- Revisión y análisis de los siguientes documentos (para más detalle, ver Anexo 1):
  - Informes de evaluación de ALIANZAS, PREMACA y LLS.
  - Términos de referencias correspondientes a estos informes de evaluación.
  - Informe de Metaevaluación de las evaluaciones de la UICN.
  - Planes de acción de los informes de evaluación de ALIANZAS y PREMACA.
  - Respuestas de gerencia de la evaluación de ALIANZAS.
  - Manual de evaluación de la UICN.
- 5HYLVLyQ GH OLWHUDWXUD VREUH OD JHVWLyQ G de proyectos en bibliografía revisada).
- Taller sobre el tema de evaluación. Como se mencionó, inicialmente el tema de evaluación era la "metaevaluación de las evaluaciones de ORMA". Fue después de la realización de este taller que se decidió que el tema de evaluación que se ajustaba a las actuales necesidades de información GH OD RUJDQL]DFLyQ HUD OD HYDOXDFLRQHV H[WHUQDV GH SUR\HFWRV"

  En este taller participaron el Coordinador de la Unidad de M&E, la red de Puntos Focales de M&E, la consultora de la Sede de UICN, el profesor guía y la evaluadora. Los temas que se discutieron fueron los siguientes: ¿Qué es la

metaevaluación?, ¿qué resultados se obtendrían con la metaevaluación?, ¿es la metaevaluación el tipo de evaluación que se ajusta a las necesidades de información de ORMA? El resultado principal del taller fue la redefinición del tema de evaluación.

4.6.2 Fase II: Formulación del primer marco teórico referencial

4.6.3 Fase III:

- Coordinador Regional de Programa, como el encargado de coordinar las actividades de las tres unidades temáticas vigentes (UPGA, BUS, AGUA).
- Coordinadora del Área de Apoyo Operacional, como la encargada de coordinar el tema administrativo de la Oficina.
- Coordinadora de la Unidad de Membresía, como vínculo de enlace con los miembros de la Oficina.

Estas entrevistas se caracterizaron por lo siguiente:

- Las entrevistas fueron individuales. En cada una de las entrevistas participaron: la persona entrevistada, la evaluadora y el profesor guía. Éste último participó en cuatro de las siete entrevistas.
- El instrumento que se utilizó fue la guía de entrevista semiestructurada elaborada en la fase anterior (ver Anexo 3: Guía de entrevista para el personal de ORMA).
- El tiempo de duración de las dos primeras entrevistas fue entre una hora y una hora y 15 min. El tiempo de duración de las cinco entrevistas restantes fue de 45 min a una hora.
- Las entrevi

- Las entrevistas se realizaron fuera de ORMA. Un evaluador fue entrevistado en un lugar público y el otro en su oficina de trabajo.
-

4.6.4 Fase IV: Reformulación del marco teórico referencial

Con base en la información emergente, el marco teórico referencial de esta evaluación fue adaptándose, conformando así, un marco teórico comprehensivo de la siguiente nueva información (ver Figura 5): Negociación de la evaluación en la etapa de contrato del proyecto; comunicación de los resultados de la evaluación; transparencia en la comunicación de los resultados de la evaluación; adaptabilidad y mejoramiento en la eficacia de los proyectos.

Las actividades que se realizaron en esta fase fueron las siguientes:

- Reuniones de análisis con el profesor guía. Los temas que se discutieron y analizaron en estos espacios fueron los siguientes:
  - Categorías conceptuales emergentes.
  - Revisión del marco teórico referencial a la luz de las categorías emergentes.
  - Vinculación entre hallazgos y el marco teórico referencial.
- Revisión de la literatura relacionada a las categorías conceptuales emergentes.

4.6.5 Fase V: Validación de resultados

El objetivo de esta fase fue presentar al personal de ORMA los resultados preliminares de la evaluación (hallazgos, conclusiones y recomendaciones) con el fin de recoger comentarios, sugerencias e inquietudes que pudieran seguir alimentando la construcción del marco teórico referencial así como la última etapa del proceso evaluativo: la redacción del informe de evaluación final.

En esta fase se realizó el taller de validación de resultados. Su aplicación fue en ORMA el 10 de febrero de 2011 entre las 9 a.m. y las 12 m. y contó con la asistencia de los siguientes participantes: Coordinador Regional de Programa, Coordinador de la Unidad de M&E, Coordinadora de la UT de AGUA, Punto Focal de M&E de la UT de UPGA, oficial de campo de la UT de BUS, representante de la Unidad de M&E de la Sede Mundial, profesor guía y la evaluadora.

4.7 Recolección y análisis de la información

Como ya se mencionó, esta evaluación se acercó a su objeto de estudio a través de la metodología cualitativa. De modo que la información que dio respuesta a las principales interrogantes de evaluación fue la que se obtuvo a través de las entrevistas individuales semiestructuradas. Así, las percepciones, experiencias y reflexiones de los participantes de la evaluación constituyeron la información fundamental para comprender e interpretar la gestión de la evaluación externa de proyectos.

Por otro lado, los datos cuantitativos recogidos mediante el cuestionario titulado, Manual de Evaluación de la UICN, sirvieron para complementar la información cualitativa referida al uso y la utilidad de esta herramienta metodológica en la gestión de las evaluaciones externas de proyectos. Es así, que estos datos tuvieron un uso específico y delimitado en esta evaluación.

Asimismo, en las distintas fases del modelo evaluativo, el análisis documental constituyó un soporte fundamental para complementar y comparar la información proporcionada por los participantes de la evaluación. En la fase exploratoria, el análisis documental fue vital porque permitió conocer, hasta cierto punto, el objeto de evaluación.

Cabe remarcar que la recolección y el análisis de la información fueron procesos que se desarrollaron de forma paralela durante el trabajo evaluativo. No obstante, por fines prácticos, en este trabajo de evaluación estos procesos se han presentado en distintas secciones. En la sección anterior, se presentaron los aspectos relacionados con la recolección de la información (entrevistas, cuestionarios, talleres). En esta sección se detallan los aspectos relacionados con el análisis de la información. A continuación se presentan estos aspectos.

una característica que podría ser deseable; sin embargo, cuando estas diferencias ponen en evidencia que en algunas unidades temáticas el personal está más conforme que en otras en

-

de buscar estrategias propias para tratar de incidir en las decisiones sobre los contenidos de los TdR, sin embargo el alcance de esas estrategias es muy limitado.

- **Participación incipiente a intermedia**: La elaboración de los TdR es un proceso compartido. El personal de ORMA opina, sugiere y construye con el cooperante algunos contenidos de los TdR. Se busca lograr un consenso. Para una de las entrevistadas este es un proceso flexible, rico y que ha ido mejorando con la práctica. Sin embargo, es importante anotar que en algunos casos está discusión e intercambio de opiniones se realiza sobre los TdR elaborados por el cooperante. Es decir, la discusión y revisión se basa en una propuesta de TdR formulada unilateralmente.

- **Participación significativa**: El personal de ORMA es el encargado de elaborar la primera versión de los TdR. Es sobre este primer documento que el cooperante opina, sugiere o ratifica los TdR elaborados. Así, en este tipo de escenarios hay mayores posibilidades de determinar una evaluación que responda a las necesidades de información del proyecto a ser evaluado. La base de los TdR son las prioridades definidas por el personal de ORMA.

Con respecto a lo anterior, se puede decir que posiblemente un mayor grado de d31n(e)4(BT1 0.22 29m[1 294.6a41(94.65a)a(BT1ía(TdR. 865 Tm[se66 3le 0 0 1sisi.T)][d3)7sbar)-

Por ejemplo: la elaboración de los TdR de una evaluación programada para el 2011 ha seguido procedimientos más ordenados y sistemáticos con respecto a la elaboración de los TdR utilizados en evaluaciones pasadas. En esta evaluación, los TdR se elaboraron de la siguiente manera:

- Primero, el equipo técnico del proyecto en conjunto con la Coordinadora y una persona externa que brinda asesoría en M&E elaboraron una propuesta de TdR.
- Segundo, otros actores de la organización implicados en los procesos evaluativos revisaron y aprobaron los contenidos de este documento. Estos actores fueron: la Directora Regional, el Coordinador Regional de Programa y el Coordinador de la Unidad de M&E. Este último aplicó la lista de comprobación de calidad para aprobar los TdR que sugiere el Manual de evaluación de la UICN.
- Tercero, la Coordinadora de la Unidad Temática envió los TdR al F1 121ur

5.1.3 Fase de implementación y seguimiento de la evaluación

-

es un tema relevante para el desarrollo organizacional, el hecho de concebir la evaluación misma como un proceso de aprendizaje, también lo es. Como señala Patton "enseñar a reflexionar evaluativamente puede generar un impacto más duradero a partir de una evaluación que el uso de los hallazgos específicos."[47] Ésta es una tarea del equipo evaluador externo, pero que debería ser prevista y promovida por el personal de la organización.

- Los procesos de evaluación han representado para el personal de ORMA por un lado, un ejercicio de aprendizaje y, por otro lado, un ejercicio evaluativo que se ha limitado a facilitar información oportuna y/o apoyo logístico a los evaluadores externos. Una de las personas entrevistadas recordaba que durante una evaluación "KXELHURQ VHVLRQ LQWHUFDPELR GH LQIRUPDFLyQ UHVFDWH GH OD H[Asimismo, los TdR de esa evaluación en particular tenían una orientación clara hacia el aprendizaje. Además, para esta misma entrevistada "HO PRGHOR GH HYDOXDFL HYDOXDGR \ QR GHO HYDOXDGRU Sin embargo otro entrevistado señalaba que: "Hay participación pero con una clara delimitación de funciones« HQWRQFHV SURSRUFLRQDPRV LQIRUPDFLyQ D

no como una oportunidad de aprendizaje de la cual se pueden obtener experiencias beneficiosas para el fortalecimiento de las capacidades del personal y de la organización.

- Desde la perspectiva de algunas personas entrevistadas, los espacios para dialogar con el equipo evaluador externo a lo largo del trabajo de campo contribuyen a mejorar la calidad del informe de evaluación. Según una de las entrevistadas, las conversaciones que tuvieron con el equipo evaluador en el trabajo de campo fueron fundamentales para que el informe de evaluación fuese valorado como útil y de buena calidad por ORMA. Según uno de los evaluadores externos entrevistados, las conversaciones que mantuvieron con el personal de ORMA a lo largo de la evaluación fueron importantes para que el informe final resultara bueno y fuese provechoso tanto para el cooperante como para la organización. De lo anterior se puede concluir que la participación activa y propositiva del personal de ORMA en los procesos de evaluación son oportunas, ya que, aumentan las probabilidades de obtener resultados útiles y valiosos para todos los implicados en la evaluación.

- La validación de resultados[48] de la evaluación habilita un espacio de diálogo y reflexión con el equipo evaluador externo importante para la finalización del informe de evaluación. Al respecto, uno de los entrevistados comentó que ³O D UHXQL y Q validación) fue útil porque proporcionó insumos para la direccionalidad de la redacción del LQIRUPH. Otro entrevistado comentó que ³HVWRV HVSDFLRV SH señalar al equipo evaluador en que se está de acuerdo y en que no, o que tenga en FXHQWD WDO R FXDO FRVD SRUTXH VL QR. Con respecto a este punto, se observaron experiencias evaluativas en que la validación de resultados se realizó exclusivamente con el personal de ORMA y, en otros casos, participó el personal de ORMA y los beneficiarios de los proyectos.

[48] **Validación de resultados**: Revisión de los resultados preliminares de la evaluación por parte del personal de la organización solicitante de la evaluación. La finalidad de la validación de resultados es retroalimentar al equipo evaluador externo en aspectos que no estén claros o donde se tenga dudas respecto a la calidad de los resultados, de manera que oriente la finalización del informe de evaluación.

Analizando estos últimos puntos desde el enfoque de evaluación de Patton, es conveniente recordar que la participación de los usuarios primarios de la evaluación a lo largo del proceso evaluativo es fundamental para asegurar la utilidad y uso real de la evaluación en la toma de decisiones y en la mejora del proyecto evaluado.

- En una de las experiencias revisadas, a pesar de que existieron los espacios de validación de resultados, el informe de evaluación fue cuestionado en más de una ocasión tanto por el personal de ORMA como por el cooperante. Según uno de los entrevistados, los cuestionamientos de este informe se centraron fundamentalmente sobre la metodología empleada y los resultados obtenidos. Según otro de los entrevistados el tema de fondo sobre los cuestionamientos presentados se fundamentaron en el hecho de que las conclusiones presentadas en el informe final podrían tener importantes implicaciones sobre la continuación de la segunda fase del proyecto. De la anterior situación se pueden señalar una serie de hallazgos importantes:
  - Primero, si la metodología no era la adecuada entonces los resultados definitivamente no iban a ser ni válidos ni confiables.
  - Segundo, si existen cuestionamientos sobre la metodología estos deberían plantearse antes que se realice el trabajo de campo. Lo cual confirma una vez más la importancia de validar tanto los TdR como la propuesta de trabajo del equipo evaluador en un momento oportuno del proceso.
  - Tercero, los procesos de validación de los resultados deben cumplir con una serie de criterios y principios básicos para convertirse en espacios de deliberación legítimos y útiles. Tanto el equipo evaluador externo como el personal de ORMA deben tener claridad sobre sus roles en encuentros de este tipo de modo que se -8(Tm[se)-6(6(e)4(x)-9))4(l)-ι

  - Quinto, el contexto político en la negociación de los proyectos es determinante en todos los procesos evaluativos, y en particular, cuando se trata de evaluaciones finales de proyectos con segundas fases potenciales.

- La respuesta de gerencia[49] al informe de evaluación

- En los procesos de evaluación en los que el personal de ORMA revisa de manera

no están siguiendo un modelo de gestión determinado, y que por lo tanto son mucho

•

Gráfico 3
Sus contenidos se ajustan a las necesidades actuales de ORMA en la conducción de evaluaciones externas de proyectos:

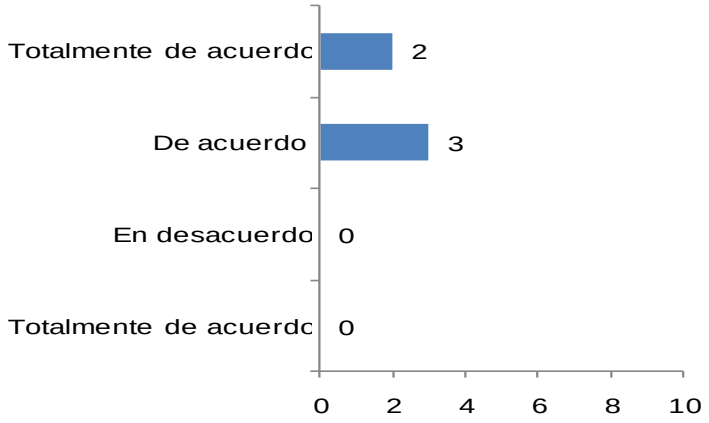

Este gráfico nos señala que para las 5 personas que conocen el Manual, los contenidos de éste se ajustan a las necesidades actuales de ORMA en la conducción de las evaluaciones externas de proyectos. Es decir, se considera que el Manual es pertinente para el objetivo que persigue.

Gráfico 4

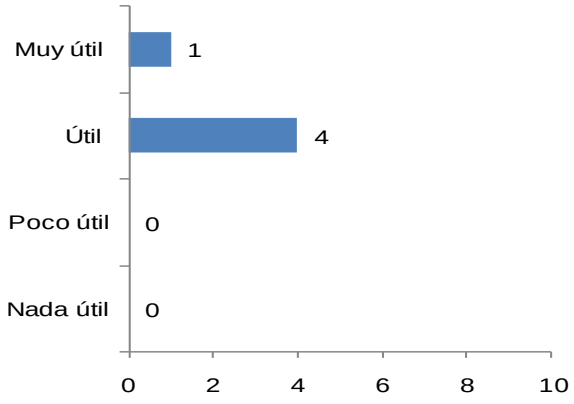

este documento tiene una serie de normas prácticas que les pueden servir para gestionar las evaluaciones externas de proyectos.

Gráfico 5

Conoce otros manuales o guías de evaluación:

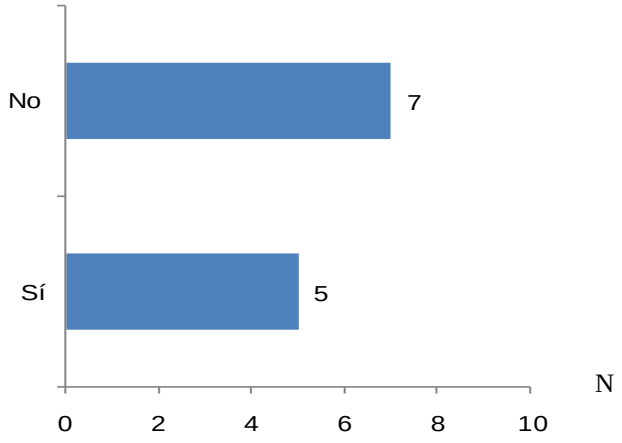

Esta pregunta la contestaron los 12 encuestados (todos). Y el resultado es particularmente relevante porque muestra que las mismas 5 personas que afirman conocer el Manual también conocen otros manuales de evaluación y los 7 que afirman no conocer el Manual tampoco conocen otros. Esto pone en evidencia que el grupo de personas encuestadas puede dividirse en dos grupos. Uno con conocimientos medios o avanzados en evaluación y otro con conocimientos escasos o nulos. Es decir una notable disparidad dentro de un grupo que en primera instancia se asumía como homogéneo con respecto a sus conocimientos en evaluación. De lo anterior se sigue que en ORMA hay un grupo de personas que podría beneficiarse de procesos de capacitación y actualización en temas relacionados con el campo de la evaluación.

En conclusión, el Manual lo conocen 5 de las 12 personas encuestadas, es decir el 42%. De estas 5 personas, sólo dos lo usan regularmente, es decir, su uso es muy limitado. No obstante, para estas 5 personas el Manual sirve, es útil y pertinente para el objetivo definido

5.2.1 Uso del proceso de la evaluación para promover el aprendizaje del personal de la organización responsable de gestionar la evaluación externa de proyectos

Los procesos de evaluación, en la forma cómo se conducen actualmente en ORMA, son aprovechados de forma insuficiente o limitada como experiencias de aprendizaje por el personal responsable de gestionar la evaluación externa de proyectos, salvo contadas excepciones, en donde algunos de los evaluadores externos han abierto, unilateralmente y por convicción propia, espacios de diálogo y colaboración con el personal de ORMA. Como se señaló en uno de los puntos de la pregunta anterior (ver 5.1.3: Fase de implementación de la evaluación, viñeta 4), la participación del personal de ORMA así como su nivel de involucramiento en el proceso de evaluación ha estado determinado por diversos factores, siendo el más determinante el enfoque adoptado por el equipo evaluador externo.

De lo anterior, se puede decir que hasta el momento en las unidades temáticas

– Plan de acción de la evaluación intermedia de ALIANZAS. UT: Equidad Social

Recomendación	Avance cumplimiento	Aprendizaje	Retos-proyección

– Plan de acción de la evaluación de PREMACA. UT: UPGA

Tema/Recomendación	Actividad	Descripción

- Se considera importante remarcar que en algunas evaluaciones los planes de acción fueron elaborados por los equipos técnicos de proyectos, y en otras evaluaciones, por solo uno de los integrantes del equipo. En este sentido se puede decir que si bien se ha verificado que las evaluaciones están siendo utilizadas para promover el aprendizaje, en algunos casos estos aprendizajes han sido mayormente individuales, y en otros casos, grupales. Por lo que se puede concluir que los espacios y oportunidades de aprendizaje no son lo suficientemente equitativos para el personal de todas las unidades temáticas de ORMA, sino que la apertura hacia estas oportunidades depende en gran medida de factores tácitos u aleatorios, como por ejemplo: enfoque de evaluación, visión del cooperante, concepción sobre la evaluación del Coordinador de la Unidad Temática, voluntad de participación e iniciativa del personal, contexto político, época del año y carga laboral en el momento en que ocurren estas evaluaciones, entre otros aspectos.

5.2.3 Uso de los resultados de la evaluación para promover el aprendizaje a nivel del Área de Programa

Los resultados de las evaluaciones están siendo escasamente utilizados a nivel del Área de Programa de ORMA. Es decir, el intercambio de información sobre estos resultados y las reflexiones sobre los mismos son informales o prácticamente inexistentes entre los equipos técnicos de las tres unidades temáticas. Si se llegan a dar es de manera casual y en términos muy generales, comentó una de las personas entrevistadas. Sólo los resultados de una de las evaluaciones revisadas fueron exhaustivamente analizados en la Reunión de

Programa[53]

Analizando los procedimientos seguidos en la divulgación y uso de los resultados de las evaluaciones desde el criterio de legitimidad organizacional, se entiende que en ORMA los procedimientos actuales para mejorar la eficacia de los proyectos gestionados, así como para hacer públicos los resultados de las evaluaciones, son limitados y podrían mejorarse sustancialmente de manera que constituyan acciones que contribuyan en el aumento de los niveles de legitimidad frente a su público interno (personal de la organización). En este sentido, el hecho que la mayor parte de los integrantes de los equipos de proyectos tengan acceso limitado a los resultados de las evaluaciones es contraproducente para la organización por las siguientes razones:

- Genera en el personal una opinión poco favorable sobre la forma cómo se gestiona la comunicación de los resultados de las evaluaciones en la organización. Esto, que está estrechamente relacionado con el aprendizaje y la adaptabilidad del personal y, por consecuencia, con la eficacia de los proyectos, incide negativamente en la legitimidad de la organización, en el sentido que le resta reconocimiento a ésta por desaprovechar recursos y acciones que podrían favorecer el cumplimiento de su misión organizacional.

- Genera un ambiente de incertidumbre sobre cómo se realizan las evaluaciones, cuáles son los resultados alcanzados, cuál es la respuesta de la organización frente a estos resultados, entre otros aspect.13 287.69 Tm -0.048 Tc[0(e)4ísuli/F1 12 0 0Tc[e a e( )]T TJETBT1 0

se

- La comunicación del Plan de Acción al cooperante es un mecanismo de legitimación eficaz, sin embargo no siempre se lleva a cabo de forma sistemática sino como respuesta a una demanda del cooperante mismo. En la mayoría de casos, las personas entrevistadas comentaron que los planes de acción se elaboraron para dar respuesta a las recomendaciones de las evaluaciones y para dejar constancia al cooperante del uso de los resultados de las evaluaciones, respecto a este segundo punto, también mencionaron que este documento por lo general lo han entregado cuando el cooperante lo ha solicitado. De esto se infiere que el personal de ORMA está aprovechando de manera insuficiente la oportunidad que representa para la organización, en términos del reconocimiento de su capacidad de adaptabilidad, ya que comunicar al cooperante de manera sistemática las actividades que se proponen para mejorar la eficacia del proyecto evaluado indudablemente incrementaría su legitimidad frente a este actor.

5.4 ¿En qué medida el Manual de evaluación de la UICN contiene los elementos metodológicos necesarios para su aplicación efectiva?

Los elementos para dar respuesta a ésta y la siguiente interrogante de evaluación se basan

- Calificación:

VI. Realización y seguimiento de la evaluación	Calificación	Justificación de la calificación
16. Facilitar el inicio de actividades 17.	3	En las sub etapas 17 y 18 se explica que es lo que se tiene que hacer. No obstante esta explicación podría ser más específica de manera que facilite al responsable de la gestión de la evaluación la implementación de las mismas.

VIII. Desarrollo de un plan de seguimiento	Calificación	Justificación de la calificación
22. Desarrollo de un plan de seguimiento	2	En esta fase se explica de manera general que la elaboración del plan de seguimiento es una actividad importante para aprovechar plenamente los resultados de la evaluación, no obstante, hace falta señalar los elementos metodológicos de cómo hacer efectiva esta actividad. Por otro lado, la matriz del plan de seguimiento que se presenta es bastante útil para organizar las propuestas de acciones concretas para las recomendaciones de la evaluación, sin embargo esta matriz se podría completar con otros elementos, como una categoría para el seguimiento de las actividades propuestas.
Sub promedio	**2**	

IX. Utilización de los resultados de la evaluación dentro de la UICN	Calificación	Justificación de la calificación
23. Utilización de los resultados de la evaluación dentro de la UICN	1	En esta fase se explica de manera general cuáles son las actividades que se deberían de realizar para utilizar los resultados de la evaluación dentro de la UICN. No se indican los pasos necesarios para hacer uso efectivo de los resultados de las evaluaciones dentro de ORMA.
Sub promedio	**1**	

PROMEDIO GENERAL	**2**

De los resultados presentados en la tabla 4 se pueden señalar los siguientes hallazgos

gestionar las evaluaciones, hace del Manual una guía de uso parcial para el personal responsable de conducir las evaluaciones en ORMA.

5.5 ¿En qué medida los lineamientos del Manual son comprehensivos de los estándares de calidad actuales en el campo de la evaluación?

Los resultados para esta interrogante de evaluación se formularon a partir de la comparación de los lineamientos del Manual con los Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo de la CAD-OCDE (2010). El proceso de análisis se basó en contrastar cada uno de los estándares de evaluación con los lineamientos del Manual y en verificar si el estándar estaba contemplado o no en estos lineamientos. De esta forma, en la tabla 5 se observará que en la columna correspondiente al Manual de evaluación de la UICN hay una calificación para cada estándar valorado así como la respectiva justificación sobre la calificación asignada. Esta calificación es una medida del grado en que el estándar está contenido o no en los lineamientos del Manual.

El criterio utilizado para valorar en qué medida los lineamientos son comprehen

Tabla 5

Valoración de los lineamientos del Manual según su nivel de comprehensión de los estándares de calidad para la evaluación de la CAD-OCDE (2010)

Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo CAD-OCDE	Manual de evaluación de la UICN

I. Finalidad, planificación y diseño	Calificación	Justificación de la calificación
1.1 Fundamentación y finalidad de la evaluación	2	Se explica que las evaluaciones en la UICN deben responder principalmente a dos propósitos: rendición de cuentas y, aprendizaje y mejoramiento. No se dan indicaciones para recoger información sobre la utilización prevista de la evaluación, otro de los planteamientos de este estándar de evaluación.
1.2 Objetivos de la evaluación	1	En ninguna sección del Manual se hace referencia a los objetivos de evaluación.
1.3 Objeto y alcance de la evaluación	2	Se explica de manera detallada cómo determinar el alcance de la evaluación. En cambio, hay poca información sobre el objeto de evaluación, al cual se hace referencia sólo en una de las secciones de los contenidos de los TdR.
1.4 Evaluabilidad	3	En el Manual se aborda el tema de la evaluabilidad, además presenta una lista de criterios para evaluar la factibilidad de la evaluación en la UICN.
1.5 Participación de los actores relevantes	3	Se indica claramente que la UICN recomienda hacer participar a representantes de los grupos interesados a lo largo de todo el proceso de evaluación, señalando además, los momentos cruciales para la participación de las partes interesadas, así como, una lista de los beneficios que entraña involucrarlas.

1.6 Cuestiones a las que pretende responder la evaluación	3	En el Manual, el tema de la formulación de las preguntas de evaluación es desarrollado de manera exhaustiva, complementado con un ejemplo de matriz de evaluación, el cual contiene las siguientes categorías: aspectos, preguntas principales, sub preguntas, indicadores, y fuentes de datos y métodos.
1.7 Selección y aplicación de los criterios de evaluación	3	Se especifica que las evaluaciones en la UICN exploran en general cinco criterios de evaluación, los mismos que propone este estándar, los cuales son: pertinencia, eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad. En el Manual se proponen además estos otros criterios de evaluación: viabilidad financiera, equidad, género y reducción de pobreza.
1.8 Selección del enfoque y de la metodología	3	Ambos temas están desarrollados en el Manual. Para el enfoque se propone una serie de preguntas que indican algunos de los factores claves que permitirán su determinación. Para la metodología se presenta indicaciones para analizarla, así como indicaciones generales sobre las ventajas e inconvenientes de los métodos de recolección de datos.
1.9 Recursos	3	En el Manual hay una sección para los recursos de la evaluación. En esta sección se aborda lo que sugiere este estándar de evaluación.

III. Seguimiento, utilización y aprendizajes	Calificación	

- Documentación relativa a la finalidad y las expectativas (TdR). De este estándar no se incluyen los siguientes elementos: objetivos de la evaluación y requisitos de presentación de informes.
- Consulta y protección de los implicados. De este estándar no se incluye información sobre la protección de los implicados en la evaluación.
- Informe de evaluación. De este estándar hace falta incorporar los siguientes elementos: Mención de los cambios y las limitaciones de la evaluación; e inclusión de las observaciones de los actores implicados.

CAPÍTULO VI
RECOMENDACIONES

En este capítulo se presentan las recomendaciones de la evaluación. Éstas han sido organizadas en torno a las siguientes secciones: normalización de la gestión de la evaluación externa de proyectos; fase de negociación de la evaluación, fase de diseño de la evaluación, fase de implementación y seguimiento de la evaluación; otros temas relacionados con las fases de evaluación; uso de la evaluación para promover el aprendizaje; uso de la evaluación para fortalecer la legitimidad organizacional; y Manual de evaluación de la UICN.

6.1 Normalización de la gestión de la evaluación externa de proyectos

Elaborar una política para la gestión de la evaluación de proyectos o definir un conjunto de principios básicos que orienten la gestión de estas evaluaciones. Para esto se recomienda realizar las siguientes tareas:

- Revisar la política actual de evaluación de la UICN.
- Adaptar de esta política los elementos que pueden ser de utilidad para la política de la gestión de la evaluación de proyectos de ORMA.
- Analizar y definir los siguientes aspectos:
  - ¿Qué se entiende por evaluación en ORMA?
  - ¿Qué se espera lograr con la gestión de la evaluación en ORMA?
  - ¿Qué papel debe cumplir el gestor de la evaluación en el proceso de evaluación externa? ¿Cuál sería su rol y funciones? ¿Con qué recursos y capacidades debería contar para poder cumplir esa función?
  - ¿Qué actividades se deberán realizar en el proceso de gestión de las evaluaciones? (ver Anexo 7: Propuesta de guía para la gestión de la evaluación externa de proyectos). Los lineamientos del Manual de evaluación de la UICN pueden ser un referente, pero puede ser que sea necesario completar o explicitar los pasos metodológicos referentes a algunas fases o momentos del proceso evaluativo que no están apropiadamente cubiertos en el Manual.

  - ¿Cómo se podría traducir a nivel operativo la gestión de la evaluación externa de proyectos (desde la etapa del contrato de proyecto hasta el uso de los resultados de la evaluación, tanto interna como externamente)? ¿Qué procedimientos, herramientas y metodologías se podrían usar?
  - ¿Qué estrategia de comunicación y divulgación de la evaluación es la más adecuada para los fines que persigue la organización? ¿Cuáles son las audiencias frente a las cuáles interesa mantener o mejorar la legitimidad de la organización?
- Socializar y validar la política de gestión de la evaluación elaborada con los equipos técnicos de los proyectos.
- Publicar y difundir la política de gestión de la evaluación de ORMA tanto a su personal interno como a su público externo (cooperantes, socios, miembros, etc.).

6.2 Fase de negociación de la evaluación

Negociar con el proyecto, la inclusión de la política o principios de la gestión de la evaluación de ORMA como criterio normalizador de los procesos evaluativos del proyecto en cuestión, puntualizando los siguientes aspectos:

- La participación del personal de la organización en la elaboración, revisión y aprobación de los TdR.
- El uso del Manual de evaluación de UICN como un referente para la elaboración de la matriz de evaluación y otros aspectos de la evaluación.
- Inclusión de espacios y mecanismos para la validación de resultados y derecho a emitir una respuesta de gerencia que permita garantizar que la perspectiva de la organización forma parte de los resultados de la evaluación, inclusive en los casos que no sea posible llegar a un consenso con los evaluadores sobre ciertos temas.

6.3 Fase de diseño de la evaluación

Para la elaboración de los TdR de las evaluaciones, se recomienda:

- Utilizar el Manual de evaluación de la UICN, aplicando específicamente los pasos propuestos en las siguientes etapas de evaluación:
  - Planificación inicial.

Cada uno de los productos esperados deberá indicar los lineamientos de su formato y contenido, así como los criterios con los cuales se los evaluará.

- Cualificación del equipo evaluador.
- Cronograma. En esta sección se deberá especificar los siguientes aspectos:
  - Plazo de la evaluación.
  - Plazos para la recepción de los productos esperados.
  - Actividades que realizará el equipo evaluador.
  - Espacios estratégicos de discusión y revisión de los productos esperados.
  - Participantes claves en los espacios estratégicos.
- Costos.
- Anexos. Incluirá los siguientes documentos:
  - Matriz de evaluación.
  - Documentos sobre el monitoreo del proyecto.
  - Secciones del Manual de evaluación de la UICN, particularmente las que pueden ser de utilidad para el trabajo del equipo evaluador. Como por ejemplo: Contenidos y organización del plan de trabajo; contenido y organización del informe de evaluación; lista de verificación para evaluar la calidad del informe de evaluación del Manual o la guía propuesta en el Anexo 8.
  - Marco lógico.
  - Otros documentos que se consideren importantes para la realización de la evaluación.

6.4 Fase de implementación y seguimiento de la evaluación

- Antes de que inicie el trabajo de los evaluadores, se recomienda:
  - Solicitar al equipo evaluador que presente y exponga el plan de trabajo que va a aplicar en el desarrollo de la evaluación (esto debe estar especificado en los TdR).
  -

TdR en relación al objeto de evaluación (proyecto que va ser evaluado) y las interrogantes evaluativas propuestas.

- Preparar toda la documentación existente con respecto al proyecto a ser evaluado, incluyendo los informes de avance y los resultados del sistema de monitoreo.

- En la primera reunión con el equipo evaluador, se recomienda:
  - Discutir la concordancia, complementariedad e idoneidad de la metodología y técnicas propuesta por el equipo evaluador en relación con la metodología presentada en los TdR y el objeto de evaluación.
  - Definir el enfoque de evaluación, es decir el modelo que orientará el proceso evaluativo. Sería recomendable que el enfoque considere oportunidades

- Elaborar el plan de acción o de seguimiento de la evaluación en forma grupal. El intercambio de experiencias enriquece el aprendizaje de los participantes y promueve el aprendizaje organizacional. Para esto se recomienda lo siguiente:
  - Primero: identificar a los usuarios primarios de la evaluación (los integrantes de los equipos técnicos destinatarios de los resultados de la evaluación).
  -

6.8 Manual de evaluación de la UICN

6.8.1 Reorganización de los contenidos del Manual

Para una lectura más ágil de los lineamientos para la gestión de evaluaciones del Manual, se recomienda lo siguiente:

- Reorganizar las etapas y sub etapas de evaluación, teniendo en cuenta las fases de evaluación propuestas en el marco teórico referencial de esta evaluación. La reorganización podría ser de la siguiente manera:
  - Fase de diseño de la evaluación:
    - Etapa 1: Planificación inicial.
    - Etapa 2: Los recursos para la evaluación.
    - Etapa 3: Elaboración de los TdR.
    - Etapa 4: Definición del evaluador o del equipo evaluador.
  - Fase de implementación y seguimiento de la evaluación
    - Etapa 5: Aprobación del plan de trabajo de la evaluación.
    - Etapa 6: Realización y seguimiento de la evaluación.
    - Etapa 7: Examen de los resultados de la evaluación.
  - Fase de uso de la evaluación.
    - Etapa 8: Desarrollo de un plan de seguimiento.
    - Etapa 9: Utilización de los resultados de la evaluación dentro de la UICN.
- Reubicar la sub etapa titulada, ³ F R P X Q L F Dr Ud G R V R E W H Q L G R V G H V Pasarla de la etapa 7 a la etapa 9.
- Enumerar las sub etapas de cada una de las 9 etapas propuestas.

6.8.2 Actualización de los contenidos del Manual

- Ampliar y reformular las interrogantes de las siguientes listas de verificación, de modo que éstas puedan ser utilizadas de forma práctica en los procesos de evaluación externa de proyectos:
  - Lista de verificación

una interrogante o sub interrogantes que especifiquen esos contenidos sugeridos, los cuales son: Razón o propósito de la evaluación; destinatarios de la evaluación; contexto y antecedentes del proyecto; preguntas y criterios de evaluación; metodología y enfoque; cualificación de los evaluadores; cronograma; productos esperados; costos y anexos.

- Lista de verificación

- Momentos oportunos para realizar las reuniones.
- Participantes clave.
- Requisitos de presentación de los informes de avance.
- Guía que se deberá utilizar para revisar el avance del equipo evaluador (plan de trabajo final).

y Completar la sub etapa de evaluación titulada ³H[DPHQGHl proyecto de FRQFOXVLRQHV (página 30 del Manual), con los siguientes elementos metodológicos:

- Participantes clave.
- Lineamientos de presentación del informe de las conclusiones.
- Guía que se deberá utilizar para examinar las conclusiones preliminares. Está guía debería de contener mínimamente el propósito, los objetivos, las interrogantes y los criterios de la evaluación.

y Especificar claramente cómo se desarrollará el proceso de elaboración del plan de seguimiento (ver 6.6.1 viñeta 2: propuesta para elaborar un plan de seguimiento).

y Especificar claramente cómo se desarrollará la utilización de los resultados de la evaluación en ORMA (ver 6.7: propuesta para el uso de la evaluación para el fortalecimiento de la legitimidad organizacional).

CAPÍTULO VII

LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN

a los intereses y necesidades de información de la organización. En este sentido, el taller que se realizó para tal fin, constituyó un primer espacio de aprendizaje tanto para el personal de la organización como para la evaluadora.

Es importante estar consciente que los tiempos que demora cada fase del proceso evaluativo no son fáciles de estimar a priori y que por lo tanto es recomendable mantener una actitud flexible y conciliadora para que los procesos se desarrollen en forma adecuada y se aprovechen al máximo.

7.2 Lecciones aprendidas en la implementación de la evaluación

- La implementación de la evaluación de un proceso permanente de una organización, como la gestión de la evaluación, tiene diferencias sustanciales con la implementación de la evaluación de un programa o proyecto. Se trata de objetos de evaluación muy distintos. Estas diferencias giran en torno a la estructura y funcionamiento mismo del objeto de evaluación, el cual, en el primer caso está conformado por un conjunto de acciones, con tiempos y recursos que no suelen estar claramente definidos.

- Algunos de los elementos que permiten el abordaje de este objeto de evaluación son los siguientes: procedimientos estandarizados para la gestión de las evaluaciones, políticas o manuales institucionales, personal dedicado a estas tareas.

- La construcción de un objeto de evaluación del cual no hay información previa y del cual el personal de la misma organización no tiene una clara idea de lo qué es, implica para quien realiza la evaluación, tener que revisar la literatura relacionada al tema, consultar a profesionales expertos en el tema, revisar información de la organización relacionada al objeto de evaluación, y a partir de todo eso esbozar un modelo que permita abordar el objeto, el cual a medida que avanza el proceso evaluativo, se va afinando y mejorando como resultado de los procesos simultáneos de recolección, análisis e interpretación de la información procedentes de los

participantes de la evaluación. La elaboración de este referente conceptual es indispensable para el abordaje de un objeto que de otra forma permanece difuso y difícil de comprender.

- El proceso de evaluación en sí mismo es un proceso abierto y flexible, es decir, que en la medida que avanza el proceso evaluativo, las premisas de las cuales se partió

7.3 Lecciones aprendidas en los talleres realizados

- **Taller para definir el tema de evaluación**

  La discusión con los usuarios primarios de la evaluación sobre sus intereses y necesidades de información, en la etapa inicial del proceso evaluativo, fue una experiencia valiosa para determinar con ellos sus reales necesidades de información. En el primer taller que se realizó en esta evaluación, estos usuarios en conjunto con profesionales expertos en el tema y la evaluadora, determinaron que la gestión de las evaluaciones externas de proyectos era el tema que mejor se ajustaba a las necesidades de información de la organización, y que la metaevaluación de las evaluaciones realizadas, si bien sería un ejercicio interesante, se encontraba en un segundo orden de prioridad.

- **Taller de validación de resultados**

  – La preparación de la presentación de los resultados preliminares de la evaluación (hallazgos, conclusiones y recomendaciones) se debería realizar en base a una primera versión del informe de evaluación (informe borrador). La redacción de esta primera versión de informe implica procesos de análisis, reflexión, síntesis, organización de las ideas y de traducir en términos comprensibles lo que se quiere trasmitir a la contraparte de la evaluación. Así, la redacción del informe borrador facilita en términos de tiempo y esfuerzo, la preparación de la presentación de los resultados preliminares de la evaluación.

  –

- El taller debe ser participativo. Los asistentes deben tener la libertad de opinar sobre los resultados que se presenten, en los momentos que consideren oportuno hacerlo. La persona responsable de la evaluación debe escuchar atentamente estas opiniones, y comentar sobre éstas en base a los hallazgos de la evaluación, manteniendo siempre presente el aspecto relacionado a la confidencialidad de las fuentes de información.

- Otro aspecto importante durante el desarrollo del taller es la actitud que se debe tener frente a cuestionamientos, sugerencias o recomendaciones que los participantes de la evaluación podrían emitir sobre los resultados presentados. Lo recomendable es mantener en todo momento una actitud de apertura ante los comentarios que mejorarían la exposición de los resultados de la evaluación. En este proceso evaluativo no hubieron cuestionamientos a los resultados preliminares de la evaluación, pero si algunas sugerencias, las cuales fueron muy bien recibidas puesto que contribuían a afinar y mejorar la exposición de esos resultados.

- Es importante tener claro que el contenido del informe final de evaluación será siempre entera responsabilidad del evaluador y que por lo tanto su criterio profesional primará, en última instancia, en la decisión sobre qué sugerencias o comentarios provenientes de las acciones de validación y retroalimentación, incluir en dicho documento. Sin embargo, se recomienda que aquellas observaciones expresadas por los participantes con las cuales el evaluador no esté de acuerdo o que no considere oportuno incluir en su informe, se registren en un capítulo aparte, aclarando que son observaciones recogidas durante el proceso no avaladas por el evaluador. Ignorar o hacer caso omiso de los cometarios recibidos simplemente porque no se consideran correctos o verídicos es un acto autoritario e impositivo contradictorio con el enfoque de evaluación enfocada en el uso y con la construcción colectiva de conocimiento, posturas que este documento propone y defiende.

UICN: Muchas voces, una tierra. El Programa 2005-2008 de la UICN. Bangkok, Tailandia, 2004.

UICN: Programa Mesoamericano de UICN. Período Intersesional 2009-2012. San José, Costa Rica, 2008.

Sitios Web

Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional. Guía de Evaluación de la ACDI. 2004. Disponible en http://www.acdi-cida.gc.ca/INET/IMAGES.NSF/vLUImages/Performancereview5/$file/spanish%20%20E%20guide.pdf al 15 de mayo de 2010.

Artículo extraído de la publicación: The Evaluation Exchange, volumen IX, Nro. 4 ± 2003/2004. Versión traducida por PREVAL marzo 2004. Disponible en http://preval.org/documentos/sobre el uso de la evaluacion.doc al 1 de noviembre de 2010.

Díez F., Blanco A., Prado C. Medición de la legitimidad organizativa: el caso de las Sociedades de Garantía Recíproca. 2010. Disponible en http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=80713681005 al 17 de octubre de 2010.

Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas (UNEG). Estándares de evaluación en el Sistema de las Naciones Unidas. 2005. Disponible en http://www.uneval.org/papersandpubs/documentdetail.jsp?doc_id=22 al 18 de mayo de 2010.

Patton, M. Lista de control de la evaluación: con énfasis en la utilización (EEU). Enero de 2002. Disponible en http://www.idrc.ca/es/ev-85972-201-1-DO_TOPIC.html al 27 de mayo de 2010.

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación; Secretaría de Estado de Cooperación Internacional; Dirección General de Planificación y Evaluación de Políticas para el Desarrollo. Manual de Gestión de Evaluación de la Cooperación Española. Aprender para mejorar, 2007. Disponible en http://www.aecid.es/export/sites/default/web/galerias/programas/Vita/descargas/Manualdegestiondeevaluaciones.pdf al 13 de mayo de 2010.

OCDE. Development Assistance Committee. Quality Standards for Development Evaluation.2010. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/55/0/44798177.pdf al 18 de mayo de 2010.

OECD. Glosario de los principales términos sobre evaluación y gestión basada en resultados Comité de Asistencia para el Desarrollo, 2002. Disponible en http://www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf al 10 de abril de 2010.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Manual de Planificación, seguimiento y Evaluación de los resultados de Desarro

ANEXO 3

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL PERSONAL DE ORMA

1. **Objetivo de la entrevista:** Recoger información relevante sobre los mecanismos, procedimientos y espacios mediante los cuales los procesos evaluativos que conduce ORMA promueven el aprendizaje y la legitimidad organizacional

2. **Temas de la entrevista:** Los grandes ejes de la entrevista fueron los siguientes temas:
   - Negociación de la evaluación.
   - Diseño de la evaluación.
   - Implementación y seguimiento de la evaluación.
   - Uso de la evaluación.

3. Interrogantes de la entrevista:

Interrogante principal:

¿Podría contarnos cómo se desarrolló la evaluación,

  - ¿Hubo taller, revisión del informe borrador, ambos, otros?
  - ¿Cómo fue la respuesta de gerencia?, ¿quién lo redactó?
- Una vez finalizado el trabajo del equipo evaluador:
  - ¿Qué hicieron con el informe de evaluación?: ¿cómo lo usaron dentro y fuera

ANEXO 4

GUÍA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA EL EVALUADOR EXTERNO

1. **Objetivo de la entrevista:** Recoger información relevante sobre su experiencia en la gestión de la evaluación externa de proyecto conducida por el personal de ORMA.

2. **Tema de la entrevista:** El eje principal de la entrevista fue la implementación y seguimiento de la evaluación.

3. **Interrogantes de la entrevista:**

Interrogante principal:
¿Podría contarnos cómo fue su participación en la evaluación externa de proyecto, desde que recibió los TdR hasta que entregó el informe de evaluación final?

Interrogantes específicas:

- En las primeras reuniones con el personal de ORMA:
  - ¿Qué temas discutieron? Plan de trabajo, apoyo logístico, metodología, etc.
  - ¿Cómo abordaron estos temas?
- Durante el trabajo de campo:
  - ¿Cómo participó el personal de ORMA?
  - ¿Hubo espacios para intercambiar información con ellos?
- En la etapa final del proceso de evaluación:
  - ¿Qué procedimientos se siguieron para validar los resultados de la evaluación?
  - ¿Hubo taller, revisión del informe borrador, ambos, otros?
  - ¿Cómo procedieron ante la respuesta de gerencia del personal de ORMA?, ¿cómo respondieron?
- Sobre el Manual de Evaluación de la UICN:
  - ¿Lo conoce?, ¿lo ha usado?, ¿le parece útil como herramienta metodológica en la gestión de las evaluaciones externas de proyectos?
- Otros: ¿Qué recomendaría para los próximos procesos de evaluación?

ANEXO 5

CUESTIONARIO

GUÍA DE LA GESTIÓN DE EVALUACIÓN EN LA UICN (MANUAL DE EVALUACIÓN)

Indicaciones:

- Queremos conocer su opinión sobre la Guía de la Gestión de Evaluación en UICN.
- Para ello a continuación encontrará algunas preguntas e ideas. Le pedimos que lea una por una en el orden en el que aparecen y nos diga su respuesta
- Para las preguntas que tienen opciones, elija la respuesta que se acerque m su opinión. Marque con una equis (x) sólo una respuesta por pregunta.
- Tenga en cuenta que las opciones de respuesta son diferentes para cada pregunta. Por favor lea cuidadosamente antes de responder.
- Para las preguntas de desarrollo, le pedimos que escriba su respuesta en la líneas en blanco.

Una vez que ha finalizado el llenado del cuestionario, por favor envíe a la siguiente dirección electrónica ginasare@hotmail.com

B. Cuestionario

1. ¢&RQRFH HO GRFXPHQWR GH *HVWLyQ GH (YDOXDFLyQ GH OD 8,&1 [3] La Gestión de Evaluaciones en la UICN; una guía para directores de programas y proyectos de la UICN**SUHSDUDGR SRU iniciativa de seguimiento y evaluación de la UICN en el 2004 (a partir de este**

3.2 Sus contenidos se ajustan a las necesidades actuales de ORMA en la conducción de evaluaciones externas de proyectos:

Totalmente en desacuerdo		En desacuerdo		De acuerdo		Totalmente de acuerdo	

3.2.1 ¿Qué contenidos le parece que hay que modificar y/o actualizar?, ¿por qué?

_____

_____

_____

3.2.2 ¿Qué sección le parece más útil?, ¿por qué?

_____

_____

_____

3.4 En general, los lineamientos metodológicos propuestos en la Guía, le parecen:

Nada útil		Poco útil		Útil		Muy útil	

4. Acerca de otros manuales o guías de evaluación

4.1 ¿Conoce otros manuales o guías de evaluación?

Sí		No	

Si la respuesta es sí, ¿cuáles conoce y cuáles de esos manuales ha utilizado en la conducción de evaluaciones en ORMA?

_____

_____

ANEXO 6

CRONOGRAMA DE TRABAJO DE LA EVALUACIÓN

(2010-2011)

Fecha	Actividad	Participante
4-02-2010	Reunión para definir el tema de la evaluación. Esta reunión se llevó a cabo en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
12-03-2010	Reunión preparatoria en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
16-03-2010	Reunión preparatoria en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
23-03-2010	Reunión preparatoria en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
28-03-2010	Reunión preparatoria en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
7-04-2010	Reunión preparatoria en ORMA	Coordinador de la Unidad de M&E
19 -04-2010	Taller de presentación del diseño preliminar de la evaluación en ORMA	• Coordinador de la Unidad de M&E • Puntos Foc52 Tf1OW*n6f1

3. Implementación de la evaluación	¥
3.1 Revisar la propuesta del plan de trabajo del equipo evaluador con la lista de verificación del Manual.	
3.2 Definir los contenidos del plan de trabajo final con el equipo evaluador.	
- Matriz de evaluación.	
- Enfoque de evaluación.	
- Metodología de evaluación. - Actividades que se realizarán con el equipo evaluador. Por ejemplo: Espacios de retroalimentación, el taller de	

ANEXO 8

PROPUESTA DE GUÍA PARA EVALUAR EL INFORME DE EVALUACIÓN

Esta guía se diseñó a partir de las siguientes guías citadas en la obra de Díaz y Rosales (2003): Guía para la Evaluación de Informes de Investigación Cualitativa de Colás y Buendia; Los Contextos de la Metaevaluación de Santos Guerra; Los Estándares de Joint Committee. Y a partir de los siguientes documentos: Estándares de Calidad para la Evaluación del Desarrollo de la CAD-OCDE; Manual de Gestión de Evaluaciones de la Cooperación Española y Manual de Evaluación de la UICN.

La forma de utilizarla es de la siguiente manera:

- **Calificación**

0 = No se evidencia.
1 = Se evidencia a un nivel bajo.
2 = Se evidencia a un nivel medio.
3 = Se evidencia a un nivel alto (deseable)

- **Rango y valoración del informe de evaluación**

De 0 a 31: Informe de baja calidad.
De 32 a 49: Informe de mediana calidad.
De 50 a 62: Informe de buena calidad.
De 63 a 72: Informe de alta calidad.

	Calificación
1. Presentación del informe de evaluación	

Lógico, entre otros documentos solicitados?	
2. Análisis del contexto y del proyecto	
2.1 ¿Se describe el contexto y los participantes implicados en el programa o proyecto evaluado (contexto: nacional, regional, institucional, destacando las prioridades ambientales y de desarrollo)?	
2.2 ¿Se describe el proyecto o programa evaluado tal como fue planificado originalmente y señala los cambios más importantes durante su evolución. (A menudo remite a elementos del Marco Lógico)?	
3. Descripción del Marco evaluativo	
3.1 ¿Se identifican los objetivos de la evaluación?	
3.2 ¿Se identifican las interrogantes de la evaluación?	
3.3 ¿Se explica suficientemente los criterios de evaluación empleados?	
4. Metodología de la evaluación	
4.1 ¿Se describe de forma detallada la metodología que se utilizó en la evaluación?	
4.2 ¿Es adecuada la metodología para dar respuesta a las principales cuestiones de la evaluación?	
4.3 ¿Se describen las técnicas de recogida y de análisis de datos?	
4.4 ¿Se han recogido o seleccionado los datos primarios y secundarios de forma adecuada?	
4.5 ¿Se detalla cómo se identifican y seleccionan a los informantes?	

5. Resulta3 Tm4T/F2 116sulta3 Tm4T/F2 4 303.29 380.5.P 60 g(R)3(e)-3(s)4(
