PROYECTO:

"Producción de Agua en Armonía con la Cultura y la Naturaleza en las cuencas de los Ríos Suchiate y Coatán", San Marcos, Guatemala.

INFORME DE EVALUACION FINAL

FECHA: Marzo 2011
Esta publicación se produce para la revisión de UICN y la Embajada del Reino de los Países Bajos y fue elaborada por Luis Alberto Castañeda y Arno Loewenthal, Consultores de CODERSA.

Indice

LISTADO DE SIGLAS/ACRÓNIMOS iv

RESUMEN EJECUTIVO v

INTRODUCCIÓN 1

SECCION I: MARCO CONCEPTUAL DE LA EVALUACION
1.1 Manejo de cuenca/microcuenca/microregión en el Proyecto 2
1.2 Metodología, la escala y el alcance de la evaluación 5
1.3 Objetivos de la evaluación 10

SECCIÓN II: LA PROPUESTA DEL PROYECTO
2.1 Datos generales del Proyecto Tacaná II 11
2.2 Marco Lógico propuesto por el Proyecto 11
2.2.1 Marco Lógico Inicial y Ajustado (2008) Propuesto por UICN para el Proyecto 13
2.3 Sistema de M&E del Proyecto 22

SECCION III. RESULTADOS ALCANZADOS Y PERCEPCIONES
3.1 Nivel de Logro de Resultados del Proyecto 25
3.2 Análisis de las Percepciones de los Resultados Logrados por el Proyecto 41
3.2.1 Consolidado de las Percepciones de los Actores sobre el Proyecto 41
3.2.2 Pertinencia/Adecuación a la Demanda 41
3.2.3 Eficacia 42
3.2.4 Eficiencia 42
3.2.5 Nivel de Logro de los Resultados 43
3.2.6 Sostenibilidad 43
3.2.7 Conclusiones sobre percepciones generales 44
3.3 Percepciones Desagregadas por (5) Criterios sobre el Proyecto 44
3.3.1 Pertinencia/Adecuación a la Demanda 44
3.3.2 Eficacia 46
3.3.3 Eficiencia 48
3.3.4 Nivel de Logro de los Resultados 49
3.3.5 Sostenibilidad 50
3.3.6 Conclusiones de análisis de percepciones detallado 51

SECCION IV. ANÁLISIS DE LA GESTION DEL PROYECTO
4.1 Arquitectura Organizacional del Proyecto 52
4.2 Gestión Administrativa y Financiera del Proyecto 54
4.3 Valor Agregado de la UICN a la Gestión del Proyecto 58
4.4 Seguimiento de la Oficina de Cooperación de la Embajada del Reino de los Países Bajos al Proyecto 61

SECCION V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 Conclusiones 62
5.2 Recomendaciones 63


UICN

RESUMEN EJECUTIVO

El Proyecto "Producción de Agua en Armonía con la Cultura y la Naturaleza en las Cuencas de los Ríos Suchiate y Coatán" más conocido como Tacaná II, es ejecutado desde agosto de 2006 a la fecha de esta evaluación final, marzo 2011 por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y desarrolla acciones de manejo integrado de cuencas en el Departamento de San Marcos.

Los Objetivos del Proyecto están dirigidos a fortalecer los procesos i1(de S)1pagi1(de1(l)3(as)-al)3(eces/M)1(de183


UICN

próximo año 2012. Donde pasar de lo reivindicativo a lo propositivo y del control social necesario a las alianzas público-privadas-sociedad civil podría ser una buena estrategia.

Por lo anteriormente expuesto, la vinculación entre la gestión integrada de cuencas con la lucha contra la pobreza es uno de los desafíos en parte pendientes de transmitir por el Proyecto a sus socios Actores, y puede ser un tema de interés de estos últimos en los procesos políticos en curso.

El Proyecto en percepción de los actores ha logrado cambiar el comportamiento de autoridades e instituciones –fundamentalmente locales- en torno a la temática del agua. El vincular el cambio del comportamiento a las acciones de Co// 294.496 684.006 262al 7(r)-6(e l)u de6(a de i)3coe5ente l da inte

22) Sistematizar las experiencias de CORNASAM y apalancamiento de fondos del Proyecto, como parte del modelo de gestión integrada de cuencas desarrollado en Tacaná II.

UICN


UICN

N
W
E
1.2 Río Suchiate
1.1 Río Coatán

1.2 Metodologia, la escala y el alcance de la evaluacion

Las herramientas de Evaluación Rápida (ER), se han convertido en un instrumento cada vez más desarrollado y común, para emprender **revisiones comprensivas de las intervenciones para el desarrollo** que realizan las Agencias de Cooperación Internacional directamente o a través de socios locales, en un relativamente corto plazo. Se espera que la expansión de esta nueva familia de metodologías de evaluación, permita a donantes, al sector público gubernamental, a ONGs y a la sociedad civil, aumentar su capacidad de producir, de una manera oportuna y sencilla, información pertinente sobre el diseño y la puesta en práctica de los programas y Proyectos para el desarrollo. Las herramientas que se han aplicado en esta evaluación, han hecho uso de una teoría estructurada sobre el marco lógico **del Proyecto: "**

UICN

UICN

SOSTENIBILIDAD	¿Los resultados/productos/objetivos (bienes y servicios) continuarán después del la intervención de PROYECTO TACANA II? ¿Las estructuras operacionales que se monto en su institución o en otras que Ud. Conozca por el PROYECTO continuarán después del PROYECTO TACANA II? ¿El equipo técnico profesional (no como personas) sino como unidad/instancia técnica continuará después del PROYECTO TACANA II? ¿Cree que las prioridades y los objetivos de PROYECTO TACANA II siguen aún vigentes y deben tener aun continuidad?

La Evaluación Rápida de establecimiento de los Resultados del Proyecto de Tacaná II abarcó cuatro pasos.

x **Revisión documental.** El equipo profesional del ProyectoTacaná II y los responsables de su seguimiento a nivel regional han revisado, establecido y llenado una matriz de resultados del Marco Lógico del Proyecto. Calificando esos resultados identificados y acordados por ellos: como logrados, no logrados, parcialmente logrados o logrados y no planificados y adecuando los indicadores y medidores como fuentes de verificación. Esto en comparación y relación con las trespropuestas parciales de ML del Proyecto enviados para su aprobación al ERPB y con los informes de ejecución anuales.

  La misión de evaluación ha hecho una revisión documental y de las fuentes de verificación de la matriz de resultados proporcionada por el Proyecto y reconstruyendo sistemáticamente los bloques del edificio del modelo lógico – hasta donde se lo desarrollo-caracterizando las relaciones entre esos bloques. Se validó una nueva matriz de resultados en el desarrollo de la que confirmó o modificó la matriz de resultados inicialmente presentada por el Proyecto. Esa matriz sirvió como fuente de verificación para el establecimiento de los resultados alos consultores y como instrumento básico indicativo para las entrevistas y encuestas de percepción sobre esos resultados a los Actores/socios/beneficiarios.

x **Entrevistas y Encuesta con los actores/socios/beneficiarios/clientes del Proyecto.** En la segunda fase la misión de evaluación utilizando la matriz de resultados del Proyecto, diseño y ejecutó unas entrevistas estructuradas (15) y en otros casos (7) se envió la Encuesta al personal local, nacional y regional responsable de UICN y de las instituciones u organizaciones socias/clientes/beneficiarias del ProyectoTacaná II (véase lista anexo 1); con cuyas entrevistas/encuestas se han documentado formalmente la percepción de esos actores/socios/beneficiarios sobre los resultados establecidos en la matriz del Proyecto, percepción referida a los resultados establecidos, la institucionalidad, sobre la eficiencia, la eficacia y la sostenibilidad de los mismos.

  Un subproducto de esta fase junto con la de la revisión documental, ha sido verificar la calidad de la información sobre los resultados del Proyectoy detectar las brechas en la información, el nivel de conocimiento de los resultados y su cualificación. Las escasas brechas cuantitativas y cualitativas sobre los resultados han sido detectadas y documentadas en las entrevistas.

x **Síntesis.** Dada la naturaleza variada de las actividades del ProyectoTacaná IIy del número de temáticas abordadas en ellos, una parte importante del esfuerzo metodológico de la misión de

SECCIÓN II: LA PROPUESTA DEL PROYECTO

2.1 Datos generales del ProyectoTacaná II

Cuadro 3. Datos del Proyecto Tacaná II	
Titulo:	"

UICN



Como se podrá apreciar tanto en la propuesta inicial como en la reformulada de los Objetivos, que es lo único formalmente presentado como Marco (o)]TJ 0 Tc 0 T895n 12

UICN

Cuadro 6:
Objetivo Específico 2 Propuesto y Ajustado

DESCRIPCIÓN	INDICADORES	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	RIESGOS
2. Actores locales gestionan y ejecutan Proyectos de desarrollo sostenible para la conservación ambiental en microcuencas estratégicas.	Los actores locales elaboran planes de mane de microcuencas por medio de los Consejos de microcuencas y con apoyo del Proyecto Tacaná y la Coordinadora de Recursos Naturales y Ambiente de San Marcos (2) Los actores locales ejecutan por medio de los Consejos de microcuencas y con apoyo del Proyecto Tacaná y la Coordinadora de Recursos Naturales y Ambiente de San Marcos, Proyectos productivos de manejo ambiental en el marco de los Planes de Manejo de microcuencas(3) Organizaciones de base fortalecidas y capacitadas en la elaboración de planes de manejo de microcuencas, canalización de recursos para la ejecución de Proyectos temas acordados por ellas con el Proyecto(4)SUBRAYADO ADICIONAL ADICIONAL. Al menos cuatro oficinas para planes	Documentos de Planes de Microcuencas	

UICN

UICN

Cuadro 12:
Avance de productos 2009

OBJETIVO ESPECIFICO DEL PROYECTO	

UICN

UICN

El Equipo Evaluador pudo constatar que el Proyecto cumplió este indicador con suficiencia. Este indicador fue alcanzado en un 100 % y el trabajo en esta área puede calificarse como sobresaliente.

El Proyecto logró la sistematización de diez casos de normas consuetudinarias. De la lista siguiente los primeros cuatro casos han sido reconocidos a través de un acta por las mismas comunidades como deberes y derechos ambientales:

1. Agua para usos doméstico en comunidad Pin Pin de microcuenca el Tojguech.
2. Mini-riego de Santa María-Canatzaj en microcuenca Esquichá.
3. Bosque las Ventanas en microcuenca Esquichá.
4. Bosque de Ojo de Agua en la microcuenca Cutzulchimá
5. Mini-riego de la comunidad de Tohaman en la microcuenca de Sibinal.
6. Agua para consumo doméstico en comunidad de Belesquizon de la microcuenca de Tojcheche.
7. Agua para consumo doméstico en comunidad de Linda Vista en la microcuenca de Tojguech.
8. Bosque comunal Los Camellos de la comunidad Nueva Reforma en la microcuenca de Las Barrancas.
9. Sistema normativo de la unidad de riego de ASUPURCA en la microcuenca de Gramal en el municipio de Catarina.
10. Sistema normativo del bosque de Toninchicanlaj de la microcuenca de Chemealón en el municipio de Tacaná.

El Equipo Evaluador recomienda que en virtud de la importancia de estos resultados, en los meses siguientes y finales del Proyecto, se hagan esfuerzos adicionales para entregar a los actores todos los casos sistematizados y continuar con la divulgación y acciones de incidencia para que los Consejos de Microcuenca e instituciones gubernamentales reconozcan la importancia de las normas consuetudinarias para el uso de bienes comunes.

Indicador 1.2: Conocimientos y experiencias locales que contribuyen a la conservación de recursos agua y bosque son sistematizadas y diseminadas a diferentes niveles mediante diferentes medios (publicaciones, radio, presentaciones, etc.)

El Proyecto ha desarrollado distintos materiales y ha realizado distintas actividades para alcanzar este indicador. Según la evaluación hecha por el equipo del Proyecto, este indicador se ha alcanzado en un 100 % respecto de lo planificado, este criterio es compartido por el Equipo Evaluador. Por lo que el Equipo Evaluador recomienda que en virtud de la importancia de estos resultados, el Proyecto realice esfuerzos adicionales para la divulgación y acciones de incidencia para que los Consejos de Microcuenca e instituciones gubernamentales reconozcan la importancia de las normas consuetudinarias y experiencias locales sobre el uso y la conservación del agua y bosques.

UICN

A través de CORNASAM el Proyecto ha apoyado la organización y fortalecimiento de la Comisión de ambiente y recursos naturales del CODEDE, como parte de la estrategia de institucionalización del Consejo.

Indicador 3.3 Coordinadora interinstitucional de recursos naturales y ambiente de San Marcos (CORNASAM) acciona en al menos cuatro microcuencas estratégicas, ejecutan Proyectos conjuntos y alcanzan mejores productos.

En criterio del Equipo Evaluador, basado en los testimonios de los propios actores y la documentación revisada, este indicador se ha alcanzado plenamente.

- La CORNASAM ha adoptado el enfoque de microcuencas. Por lo anterior, ha organizado tres comisiones, una por cuenca: Suchiate, Coatán y Naranjo. Estas comisiones planifican y ejecutan acciones conjuntas en 6 microcuencas (3 en Coatán, 2 en Suchiate y dos en El Naranjo).

- La CORNASAM evalúa que los resultados en la ejecución de acciones conjuntas, son los siguientes: a) ahorro de recursos, b) mayor cobertura, c) mejor asistencia técnica, d) procesos participativos de planificación y ejecución de Proyectos, e) resultados de Proyectos con la calidad requerida y a menor costo, f) atención integral de las necesidades presentadas por los consejos de microcuenca, y g) ha fortalecido el desempeño de las entidades gubernamentales.

- Asimismo, la CORNASAM ha realizado una evaluación de su funcionamiento, producto de la misma, ha implementado un normativo interno de fun

UICN

(Gramal) y cantón Los Laureles (Esquichá). Asimismo, se han equipado las 19 COLRED conformadas en las comunidades de las comunidades indicadas con anterioridad.

- Se han desarrollado 42 talleres en los cuales se han capacitado 455 personas (150 mujeres y 305 hombres) en la siguiente temática: gestión de riesgo, bases legales de las COLRED, funcionamiento de miembros de las comisiones de la COLRED, primeros auxilios, búsqueda y rescate, inundaciones, deslizamientos.

- Se han implementado 3 Proyectos de adaptación al cambio climático (reforestaciones y tratamiento de aguas mieles) con el Programa de Pequeñas Donaciones del PNUD.

- Obtenido financiamiento para Proyectos de prevención y/o mitigación derivados de los planes de manejo microcuenca: el Fondo Nacional para la Conservación –FONACON aprobó el Proyecto "Implementación de viveros forestales con enfoque a cambio climático" para ejecutarse en el año 2011. Además, se ha iniciado la ejecución del Proyecto e

- Con el INAB y el Proyecto Bosques Paisajes y Medios de Vida Sostenible de la UICN se coordinó la realización de dos estudios para utilizar los fondos de los programas de incentivos como parte de los aportes al FOGESHIP en el municipio de Tacaná.

- Las municipalidades de San Pablo y Tacaná han emitido acuerdos municipales para la implementación de un Programa de Pago por Servicios Ambientales Municipales.

- Se ha realizado la asignación de fondos a la AFOGESHIP Agua Viva del municipio de San Pablo.

- Se han elaborado los planes estratégicos y los planes operativos 2011 de los FOGESHIP San Pablo y Tacaná. Actualmente las asociaciones (AFOGESHIP) cuenta con una estructura organizativa formada para dicha administración y en la cual participan varios actores (Municipalidades, Sector Privado organizado, Consejos de Microcuencas, COCODES urbanos e instituciones).

No obstante el avance del Proyecto en el alcance de este objetivo, la Misión considera que el Proyecto para dar sostenibilidad a estos resultados iniciales; debe realizar aún esfuerzos en los siguientes aspectos:

1)

y realista, técnicamente sustentada, del crecimiento y sostenimiento del Fondo para los próximos años, considerando los distintos escenarios y estrategias de gestión, obtención y ejecución de fondos.

OBJETIVO ESPECIFICO 7.

Indicador 7.1: Actores locales conjuntamente con la unidad ejecutora del Proyecto, realizan el seguimiento y evaluación de las actividades participativas.

Con cierta regularidad el Equipo Gerencial del Proyecto y varios actores locales seleccionados han participado en una instancia técnica de apoyo[4], en cuyo seno se han discutido algunos temas importantes del Proyecto, pero fundamentalmente se ha dado seguimiento a la gestión del Proyecto. Algunos Actores locales participantes de ésta instancia ha relevado el hecho de la transparencia y participativo de ésta instancia.

Indicador 7.2. Se sistematizan y difunden las experiencias y métodos del Proyecto a instituciones y organizaciones fuera del área de influencia directa del Proyecto (nacional e internacional) y, en los casos que amerite, se realizan actividades de capacitación.

Existe una divergencia de opinión entre el Equipo Evaluador y algunos miembros del Equipo de la UICN, en criterio de estos últimos los elementos no plenamente logrados del modelo, no impiden el difundir el modelo o partes de él. Los Evaluadores consideran que si bien es posible difundir aspectos o componentes del modelo de gestión integrada de microcuenca; antes de la difusión y replica del modelo, debe concluirse plenamente el mismo y que es un riesgo su difusión parcial, porque en muy buena medida el éxito del modelo desarrollado por el Proyecto, consiste en ser un sistema de componentes que relacionados entre sí, no sólo sumados, permiten tener un modelo.

Indicador 7.3[5] Conocimientos y experiencias locales referidas a producción orgánica y uso de de semillas ancestrales son sistematizadas en al menos dos microcuencas de la parte alta y diseminadas a diferentes niveles mediante diferentes medios (publicaciones, radio, presentaciones, etc.)

Este indicador, que es adicional no ha sido ni debe ser desarrollado y el Equipo del Proyecto no debe enfocarse en esta fase de cierre del mismo.

Indicador 7.4 Los Informes Técnicos y Financieros son enviados a tiempo y aceptados.

Los Evaluadores han tenido pleno acceso a todos los informes de éste proyecto y en su entrevista con el funcionario de la ERPB en Guatemala, este no ha manifestado ningún comentario al respecto, excepto que muchos de los informes narrativos, no estaban basados en resultados y terminaban siendo una relación de las actividades desarrolladas.

[4] Comité Técnico Asesor del Proyecto.
[5] En la reformulación del ML del 2008 este indicador fue reformulado y ubicado en el Objetivo Específico 1.

UICN

UICN

UICN

Una mayoría menos claramente definida y más tendiente a la media, considera que los Resultados obtenidos por el Proyecto tendrán continuidad después del mismo, que las estructuras organizativas u operativas montadas a partir del Proyecto tendrán continuidad. a6>4(i)3Tt

Más de dos tercios de los Actores consideran que el Proyecto ha incorporado los ejes transversales de género y etnicidad adecuadamente en su diseño e implementación.

Aunque dos tercios consideran que el Proyecto ha tenido una capacidad de adaptación al contexto político cambiante –fundamentalmente el Municipal- claramente presente en el 2008 a nivel local y nacional, cerca a un 30% consideran que esa capacidad es media en el Proyecto. Considerando el presente año como de cierre y de un proceso electoral y de nueva transición, habría que revisar las estrategias de institucionalización y sostenibilidad que se usaron para hacerlas más eficientes.

La percepción de los Actores sobre el vínculo entre la gestión integrada de cuencas y la a er363-n de l a]TJ 0.2

INFORME DE EVALUACION DEL PROYECTO:

“

UICN

¿Cómo calificaría la asistencia técnica de PROYECTO TACANA II para lograr los resultados/objetivos o productos identificados?	5	22,72	8	36,36	7	31,81	2	9,0	22	100

¿Los riesgos internos y externos de PROYECTO TACANA II han sido previstos o han tenido respuestas, que han permitido manejar esos riesgos y las oportunidades de manera apropiada y oportuna?					**3**	**13,63**	**11**	**50,0**	**2**	**9.0**	**6**	**27,27**	**22**	**100**

Fuente: Elaboración propia en base a entrevistas y Encuestas de la Evaluación Final Tacaná II, Marzo 2011.

3.3.5 Sostenibilidad

Cerca de los dos tercios de los Actores piensan que los Resultados alcanzados por el Proyecto tendrán continuidad una vez concluido éste.

En una tendencia que supera los dos tercios los consultados consideran que las estructuras operacionales creadas o que el Proyecto contribuyó a su creata que supera los dos tercios los I, Ma l1cio2 0 Twe.

INFORME DE EVALUACION DEL PROYECTO:
“

Una amplia mayoría de los Actores piensan que los Resultados alcanzados por el Proyecto, las estructuras operativas y que las temáticas abordadas, tendrán continuidad una vez concluido éste, lo que la sostenibilidad institucional parece percibida claramente.

SECCION IV. ANÁLISIS DE LA GESTION DEL PROYECTO

4.1 Arquitectura Organizacional del Proyecto

La arquitectura institucional del ProyectoTacaná II sigue el modelo clásico y establecido por las ONG Internacionales para la gestión de sus Proyectos locales en Guatemala y otros países. Las decisiones estratégicas son asumidas por la Oficina Regional en este caso de UICN; la asignación de los recursos y la supervisión de la Gestión son la responsabilidad de ésta misma instancia regional y la gestión de las actividades y el logro de los

Entre los grandes logros de UICN para Tacaná II fue el alto grado involucramiento de actores locales en el proceso de selección y seguimiento del Proyecto, fundamentalmente en la selección del personal profesional -aunque algo complicado este proceso de Participación local- según lo manifestado por algunos participantes.

Organigrama del ProyectoTacaná II

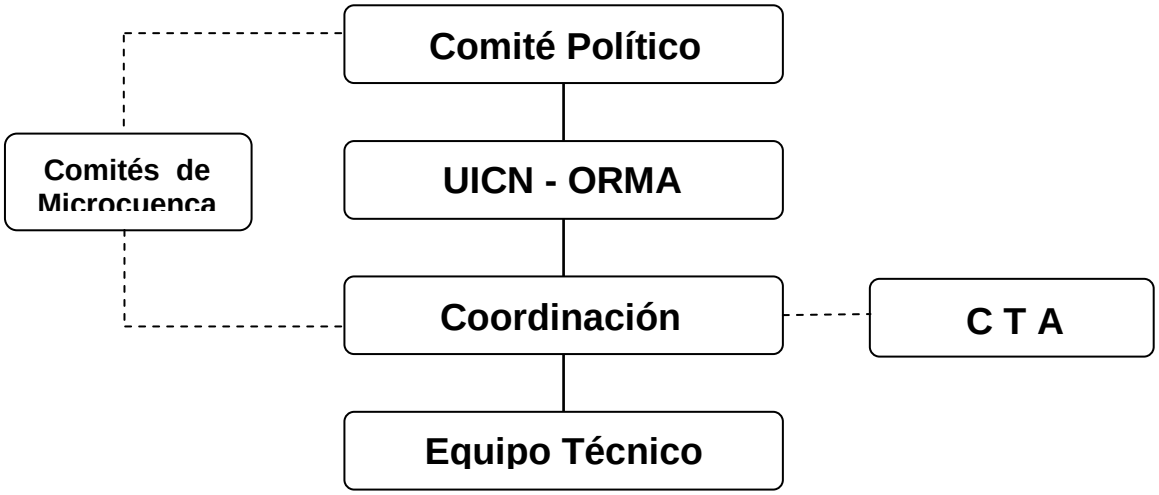

Fuente: Informe de UICN a la ERPB, 2007.

UICN por la información que se ha hecho llegar al Equipo Evaluador, cuenta con políticas adecuadas para el cumplimiento de sus objetivos. Sin embargo, estas políticas no siempre encuentran un ambiente y condiciones de adaptabilidad local, eso puede significar mayores o menores grados de esfuerzos locales para "convencer" o someterse a esos marcos normativos institucionales regionales.

El Proyecto no cuenta con un Manual de Ejecución del mismo, que más allá de la formalidad o no de su existencia, podría hacer ayudado a su gestión tanto temática, como operativa. Sin embargo, no hay duda que UICN por su larga trayectoria institucional internacional, cuenta con todos los manuales, procedimientos, mecanismos administrativos, financieros y organizativos, a un nivel plenamente satisfactorio, que es lo que seguramente le permite contar con una credibilidad local, nacional e internacional, que le han permitido en el caso del Proyecto Tacaná II contar con un nivel de credibilidad institucional muy alto que seguramente contribuyó al logro significativo de los resultados.

No se ha encontrado evidencias que los procesos administrativos necesarios para la gestión y control de las operaciones del Proyecto centralizados hayan ofrecido niveles de dificultad en la gestión del mismo,

Es, necesario redefinir una política de contenidos e instrumentos de información y comunicación interna y externa del Proyecto, que permitan una comunicación asertiva, orientada al cambio de comportamiento y

INFORME DE EVALUACION DEL PROYECTO:
“

cierre- tanto en la ejecución financiera como técnica. El monitorear estos comportamientos permiten ajustar de manera regular la planificación del Proyecto en los financiero y técnico y con ello aumentar las posibilidades de éxito en el desempeño.

4.3 Valor Agregado de la UICN a la Gestión del Proyecto

Este es un tema en el caso del presente Proyecto, que en apariencia pareciera de mayor interés en ser determinado por la Embajada del Reino del los Países Bajos en Guatemala, los Evaluadores quisiéramos expresar que los criterios a verterse se circunscriben únicamente al presente ProyectoTacaná II y que el Equipo Evaluador no tiene evidencias ni elementos de juicio suficientes para generalizar sus criterios sobre el tema.

Para comenzar el abordaje de este tema, sensible para los actores responsables de la gestión del Proyecto, hemos recibido de los mismos un detalle de lo que se deben considerar como elementos sobre el valor agregado que UICN ha podido aportar al ProyectoTacaná II:

- Tanto el equipo de ProyectoTacaná II como los miembros de la Oficina Regional directamente vinculados las Proyecto son parte integral de un equipo y de un programa sobre Recursos Hídricos a nivel global. El ProyectoTacaná II es parte de una red de trabajo e iniciativas a distintos niveles que son conocidas mundialmente y que aprenden mutuamente. El equipo de Proyecto en el campo cuenta con la asesoría técnica y coordinación de un equipo desde Costa Rica e incluso desde Suiza, para aplicar modelos exitosos o no y para aprender de ello.

- Apoyo en el manejo de Recursos Humanos que tiene la UICN, ha garantizado la continuidad de las personas técnicas que están trabajando en el campo (UICN cumple con todos los requisitos de beneficios sociales en todos los países de la región y del mundo).

- La relación integral de las acciones del Proyecto y su equipo de campo también han logrado posicionarse en foros mundiales y ganar algunos galardones que dan reconocimiento a este nivel tales como el Premio del Foro del Agua del Japón o que se cite como un estudio de caso dentro de la Iniciativa Mundial de la UICN sobre Adaptación al Cambio Climático.

- El ser parte de una red mundial también ha permitido al personal del Proyecto participar de eventos incluso mundiales de la UICN (Congreso sobre Conservación en Barcelona, España 2008; PEDRR Workshop: Ecosystems, Livelihoods and DisasterRiskReduction en Bonn, Alemania 2010).

- Acompañamiento sobre gestión de cuencas, y de coordinación con instancias regionales y mundiales. Se ha dado acompañamiento en temas técnicos como enfoque de ecosistemas, medios de vida, gobernanza de aguas, incidencia política, elaboración de vídeos comunitarios, herramientas para identificación de capacidades para la adaptación al cambio climático, bienes y servicios ambientales, etc.

- L

Mesoamericano. Es por esto que, la UICN ha concentrado sus esfuerzos en la búsqueda de financiamientos (ver cuadro de apalancamientos) que son el resultado, nuevamente de un trabajo en equipo regional y local.

TOTAL FONDOS DEL PROYECTO TACANA II DEL 01-AGOSTO-2006 AL 31-JULIO-2011		2.500.000,00	30,35%
TOTAL FONDOS POR APALANCAMIENTO		5.736.579,82	69,65%
TOTAL FONDOS INVERTIDOS EN ÁREA PROYECTO (TACANA2 + Apalancamientos)		8.236.579,82	100,00%

FONDOS POR APALANCAMIENTO PROYECTO TACANA II GESTIONADOS POR UICN

Expresado en dólares

No.	NOMBRE DEL PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION

- Acompañamiento administrativo y financiero con visitas periódicas por parte de personal desde Costa Rica e incluso desde Suiza. Excelencia en la parte financiera administrativa y claridad de cuentas.
- Capacidad de convocatoria de la UICN como una organización con credibilidad de parte de todos los sectores: gubernamentales, no gubernamentales e incluso privados.
- Trayectoria de UICN de más de 60 años a nivel mundial trabajando en el tema de ambiente y desarrollo (enorme credibilidad y reconocimiento a nivel nacional, regional y global).
- Experiencia en la región desde hace más de 20 años realizando Proyectos de manejo recursos naturales y ambiente.
- Liderazgo en el tema de Bienes y Servicios Eco sistémicos en la región y creación de redes locales para la armonización de conceptos y metodologías para la implementación de iniciativas de esta naturaleza; incluida la metodología para la identificación de las verdaderas zonas de recarga hídrica basada en estudios hidrogeológicos.

UICN

gubernamental, siempre han apreciado en gran medida la "tradicional confianza" de la Cooperación Holandesaque ha contribuido consideran ellos, al desarrollo sectorial.

Los evaluadores no tienen elementos suficientes para emitir una opinión sólida sobre la eficiencia o no del valor agregado aportado por UICN al ProyectoTacaná II, pero están convencidos que éste ha existido y ha sido valioso en varios ámbitos y débil en pocos.

SECCION V. CONCLU02 Tcj EMC /P <</6nal

UICN

UICN

ANEXO 1: LISTADO DE ACTORES ENTREVISTADOS Y ENCUESTADOS

Fecha	Entrevistas
[redacted]	Chang Presidente del Consejo de Microcuenca Cabuz
	Miguel Ángel Paz, Presidente del Consejo de Microcuenca Río Gramal
	William Bautista, Gerente de ASUPURCA
	Leonardo Barrios, Presidente del Consejo de Microrregión Suchiate Ocós
	Fausto Romero, Presidente del Consejo de Microcuenca Río Negro
	Federico Herrera, Presidente Cooperativa La Bendición R.L.
	Ronal López, Gerente AFOGESHIP San Pablo
	Rodolfo Barrios, Secretario Municipal
	Rolando Abel Gabriel, Alcalde Municipal San Pablo
	Ing. Carlos Mas, Asesor del Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala
	Olov Aftterfors, Asesor Medioambiente, Embajada del Reino de los Países Bajos en Guatemala
	Dr. Luis Ferraté, Ministro de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala,
27/3/11	Msc. Rocío Córdoba Muñoz , Coordinadora Unidad de Gestión del Agua. UICN
20 y 21/3/11	MsC. Carlos Rosal del Cid, Ofi2 1 Tf 0.,l . CUI 9 394.44 1 Tf 9 0 0 9 97.44 286.446/TT2 2T Q q 126
